

Magistrát města Děčín materiál do jednání zastupitelstva města dne: 30.06.2016		ZM 16 06 04 01
Název:	Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město	

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město a tuto

s c h v a l u j e.

Stanovisko RM:

Rada města projednala Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město a svým usnesením č. RM 16 11A 36 02 ze dne 21. 6. 2016 doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město.

Cena:	0 Kč
Návrh postupu:	RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

Dle Příručky pro předkladatele IPRM v IOP, Příloha č. 9 – Závěrečná zpráva o realizaci IPRM byla vypracována Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město, ve které je zhodnocen postup realizace IPRM v uplynulých letech.

Dne 15. 6. 2016 byla tato zpráva doporučena členy Řídícího výboru IPRM k předložení do orgánů města ke schválení. Následně bude odevzdána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Příloha:

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré Město

Zpracoval:	Mgr. Petr Kužel	OR	
Předkladatel:	Ing. Valdemar Grešík	náměstek	
Počet příloh:	1		

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM	
Registrační číslo IPRM:	1/SZ/41
Název IPRM:	IPRM Děčín – sídliště Staré Město
Celková výše alokace dle Dohody v Kč:	2 948 794 x 27 = 79 617 438 Kč
Datum zahájení realizace IPRM:	3. 7. 2009
Datum ukončení realizace IPRM:	31. 12. 2015
Datum předložení zprávy:	04/07/2016

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	261238
Název:	Statutární město Děčín
Adresa:	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martina Štajnerová
Telefonní číslo/mobil/Fax:	412 593 424 / 604 210 276
E-mail:	martina.stajnerova@mmdecin.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

V rámci realizace IPRM došlo v první řadě ke schválení IPRM jako celku dne 27. března 2009 ministrem pro místní rozvoj. Následně byla vypracována Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města. Dohoda byla schválena ZM Děčín č. usnesení ZM 09 06 03 01 ze dne 25. 6. 2009 a podepsána byla ze strany SM Děčín dne 25. 6. 2009 a ze strany MMR dne 3. 7. 2009. Po zahájení realizace IPRM k 3. 7. 2009 byly zahájeny přípravy na vyhlášení prvních výzev v rámci oblasti podpory 5.2 a) i 5.2 b). Výzvy byly vyhlášeny dne 1. 9. 2009 jako kontinuální s konečným datem příjmu žádosti do 31. 10. 2013 do 12,00 hod. v případě obou výzev a zveřejněny na úřední desce MM Děčín dne 31. 8. 2009.

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v roce 2009 byla schválena zastupitelstvem města dne 25. 3. 2010 pod č. usnesení ZM 10 03 03 01. V březnu 2010 byla městem vypracována „Příručka pro hodnotitele projektů v oblasti podpory 5.2.b)“, na MMR ČR byla odeslána dne 7. 4. 2010; byl vytvořen Seznam hodnotitelů projektu v této oblasti podpory (dle jmenování ŘV IPRM dne 11. 8. 2009). V prosinci 2010 bylo zasláno na pobočku MMR v Chomutově „Hodnocení rizik vztahující se k implementaci IPRM v regionu soudržnosti Severozápad za období 1. 7. 2010 - 30. 9. 2010 + 4.Q“.

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v roce 2010 byla schválena zastupitelstvem města dne 24. 3. 2011 pod č. usnesení ZM 11 03 03 01. Dne 4. 2. 2011 byl podepsán Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM, jehož obsahem bylo vypuštění slov „do 31. 12. 2010 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 13 % CZV IPRM“ v článku 3, odst. 2.

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v roce 2011 byla schválena zastupitelstvem města dne 22. 3. 2012 pod č. usnesení ZM 12 03 04 01. Dne 18. 7. 2012 byl podepsán Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM, kterým se mění znění v článku 2 „Předmět dohody“ v odst. 1 (jedná se o snížení celkových způsobilých výdajů IPRM na 6 367 tis. EUR a snížení monitorovacích indikátorů výsledku) a v odst. 2 (jedná se o snížení celkové částky ERDF na 3 952 277 EUR).

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v roce 2012 byla schválena zastupitelstvem města dne 28. 3. 2013 pod č. usnesení ZM 13 02 03 01. Dne 21. 8. 2013 byl podepsán Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM, kterým se mění znění v článku 2 „Předmět dohody“ v odst. 1 (jedná se o snížení celkových způsobilých výdajů IPRM na 4 750 tis. EUR a snížení monitorovacích indikátorů výsledku) a v odst. 2 (jedná se o snížení celkové částky ERDF na 2 948 794 EUR).

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v roce 2013 byla schválena zastupitelstvem města dne 27. 3. 2014 pod č. usnesení ZM 14 03 03 01. Ke dni 30. 6. 2014 byla ukončena Výzva č. 1 (Oblast podpory 5.2 a)) – důvodem bylo vyčerpání celkového finančního objemu pro tuto výzvu ve výši 70 209 485 Kč. Dne 24. 7. 2014 byl podepsán Dodatek č. 4 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM, kterým se mění znění v článku 2 „Předmět dohody“ v odst. 1 (jedná se o zvýšení celkových způsobilých výdajů IPRM na 5 107 tis. EUR). Ke dni 12. 11. 2014 došlo k vyhlášení Výzvy č. 4 (Oblast podpory 5.2 a)) v celkovém finančním objemu 17 195 294 Kč – důvodem bylo dočerpání zbytku alokace v IPRM a ukončení Výzvy č. 1; souhlas MMR ze dne 14. 10. 2014.

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM ke dni 31. 12. 2014 byla schválena zastupitelstvem města dne 26. 3. 2015 pod č. usnesení ZM 15 03 04 01. Ke dni 30. 4. 2015 do 12:00 hod. 2014 byla ukončena Výzva č. 4 (Oblast podpory 5.2 a)) v celkovém finančním objemu 17 195 294 Kč, do které byl předložen poslední projekt „4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“, CZV 16 545 811,- Kč (ERDF 14 063 939,20 Kč).

**Realizace dílčích projektů v IPRM:**Oblast podpory 5.2 a)

V r. **2009** v této oblasti podpory probíhala příprava technických dokumentací projektů.

V r. **2010** byly dokončeny přípravy technických dokumentací, byl vydán územní souhlas (hřiště).

V roce **2011** byly do Výzvy č. 1 podány dvě žádosti o dotaci:

- na realizaci projektu města Děčín „**1. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město**“, CZ.1.06/5.2.00/07.07824, v částce 10 552 818 Kč, ukončení projektu 31. 10. 2011. MZ a ŽOP byly podány dne 9. 11. 2011 na CRR Chomutov. Jednalo se o čerpání alokace 2011.
- na realizaci projektu města Děčín „**2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město**“, CZ.1.06/5.2.00/07.07823, v částce 7 780 000 Kč s předpokládaným termínem dokončení stavby do 30. 9. 2011 tak, aby bylo čerpáno z alokace roku 2011. Dlouhým schvalovacím procesem na CRR Chomutov došlo k posunu VŘ na zhotovitele stavby a tím k posunu termínu realizace tak, že dokončení stavby přesáhlo původně plánovaný maximální termín 30. 9. 2011. Proto realizace projektu musela mít vyřazena z alokace r. 2011 a přesunuta do alokace r. 2012. Vzhledem k tomu, že se stavba z velké části dotýkala okolí základní školy, bylo Oznámením o změnách v projektu č. 2 požádáno o posun termínu dokončení projektu do 31. 8. 2012, aby stavba mohla probíhat v období letních prázdnin. Oznámením o změnách v projektu č. 3 bylo nakonec oznámeno odstoupení od projektu a to z důvodu potřeby úpravy projektové dokumentace, neboť se před započítáním prací nepodařilo vyřešit veškeré majetkoprávní vztahy.

V roce **2012** byla podána nová žádost o dotaci na projekt - **2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město**; CZ.1.06/5.2.00/07.08481 – tento projekt byl předložen na město dne 22. 10. 2012; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 12 09 03 02 ze dne 22. 11. 2012, dne 28. 11. 2012 byla podána žádost o dotaci na CRR Chomutov; dne 7. 12. 2012 obdrželo město Výzvu k doplnění žádosti, odpovědělo dne 3. 1. 2013. CZV 50 669 442 Kč. Realizace tohoto projektu byla ukončena 31. 7. 2014. ŽOP druhé etapy byla podána na CRR dne 29. 08. 2014.

V roce **2013** byla podána žádost o dotaci na projekt **3. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město**; CZ.1.06/5.2.00/07.09251 – tento projekt byl předložen na město dne 19. 8. 2013; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 06 05 06 ze dne 19. 9. 2013, dne 10. 10. 2013 byla podána žádost o dotaci na CRR Chomutov; dne 16. 10. 2013 obdrželo město Výzvu k doplnění žádosti, odpovědělo dne 18. 10. 2013. CZV 5 781 947,79 Kč. Realizace byla ukončena 30. 9. 2014. ŽOP byla odeslána na CRR dne 30. 10. 2014.

Poslední žádost o dotaci byla podána v roce **2015** do Výzvy č. 4 na projekt - **4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město**; CZ.1.06/5.2.00/07.09772 – tento projekt byl předložen na město dne 10. 4. 2015; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 15 04 05 10 ze dne 23. 4. 2015; dne 20. 5. 2015 byla podána žádost o dotaci na CRR Chomutov; dne 29. 5. 2015 obdrželo město Výzvu k doplnění žádosti, odpovědělo dne 19. 6. 2015; CZV 16 438 667,12 Kč. Realizace tohoto projektu byla ukončena 30. 11. 2015. ŽOP byla podána na CRR dne 29. 12. 2015.

Oblast podpory 5.2 b)

V roce **2009** nedošlo k podání žádného projektu. Důvodem k této situaci bylo nevyjasnění pravidel čerpání mezi MF a MMR a přijetí novely o vlastnictví bytu. S ohledem na tuto situaci majitelé domů vyčkávali a plánovali podání projektů po přijetí této novely.

V roce **2010** byly předloženy do Výzvy č. 2 na město Děčín a schváleny 3 projekty a to:

1. **Rekonstrukce bytového panelového domu Jezdecká 321/13, Děčín** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 10 04 04 03 ze dne 29. 4. 2010; reg. č. projektu: CZ 1.06/5.2.00/07.06715, ukončení projektu 25. 9. 2010.
2. **Rekonstrukce bytového panelového domu Žerotínova 357/48, Děčín** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 10 04 04 03 ze dne 29. 4. 2010; reg. č. projektu: CZ 1.06/5.2.00/07.06716, ukončení projektu 31. 12. 2010.
3. **Modernizace výtahů**, Litoměřická čp. 334, 335, 336 – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 10 06 06 05 ze dne 24. 6. 2010; reg. č. projektu: CZ 1.06/5.2.00/07.07023, ukončení projektu 31. 7. 2011.

V průběhu realizace **vystoupilo** z IPRM Děčín – sídliště Staré Město **7 dílčí projektů** v celkové částce cca **14 771 tis. Kč**. Od realizace je odradila přílišná složitost administrace projektů a nejednotnost názorů členů bytových družstev a SVJ.

V roce **2011** bylo předloženo na město Děčín 8 a schváleno 7 projektů a to:

1. **Modernizace výtahů, předkladatel Bytové družstvo Žerotínova 355/44** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011; reg. č. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07752, ukončení projektu 29. 2. 2012.
2. **Rekonstrukce a modernizace společných prostor, předkladatel Bytové družstvo Žerotínova 355/44** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011; reg. č. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07753, ukončení projektu 20. 1. 2012.
3. **Ústřední topení, předkladatel Bytové družstvo Žerotínova 355/44** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011; reg. č. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07751, ukončení projektu k 30. 9. 2011.
4. **Rekonstrukce vnitřní splaškové kanalizace, předkladatel Bytové družstvo Žerotínova 355/44** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011; reg. č. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07750, ukončení projektu k 30. 11. 2011.
5. **Rekonstrukce vodovodní přípojky, předkladatel Bytové družstvo Žerotínova 355/44** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011; reg. č. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07754, ukončení projektu k 30. 9. 2011.
6. **Rekonstrukce a modernizace osobního výtahu v panelovém domě Příčná 352/8, Děčín, předkladatel Stavební bytové družstvo Děčín** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 11 06 03 04 ze dne 23. 6. 2011; reg. č. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07892, ukončení projektu 31. 7. 2012.
7. **Rekonstrukce bytového panelového objektu Jezdecká 337/3, 338/5, 339/7, Děčín, předkladatel Stavební bytové družstvo Děčín** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 11 06 03 04 ze dne 23. 6. 2011; reg. č. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07891, ukončení projektu 31. 12. 2011.
8. **Rekonstrukce bytového domu Rakovnická 196, Děčín 3 – Staré Město, předkladatel R.I.P, spol. s r.o., Březová 372/83, 405 02 Děčín** – schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM 12 02 04 09 ze dne 23. 2. 2012, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08211, ukončení projektu k 31. 7. 2013.

Realizace ostatních plánovaných projektů ze strany vlastníků BD byla vzhledem k prodloužení přípravy posunuta do dalších let.

V roce **2012** byly předloženy na město Děčín do Výzvy č. 2 další 3 projekty:

1. **Děčín-Staré Město, Oblouková 374 - zateplení budovy, výměna výplní, rekonstrukce výtahů** – předložen na město dne 4. 1. 2012; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 12 02 04 16 ze dne 23. 2. 2012, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08188; ukončení projektu 31. 12. 2012.
2. **Rekonstrukce plynovodu – bytový dům Rakovnická 307/21 a 308/23, Děčín 2** – předložen na město dne 4. 7. 2012; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 12 07 06 01 ze dne 20. 9. 2012, plánované zahájení projektu 1. 10. 2012, plánované datum ukončení projektu 31. 12. 2012 (stav ze žádosti). Bylo vydáno Potvrzení města, na CRR nepodáno - změna právní subjektivity žadatele.

Opětovně byl předložen na město dne 6. 3. 2013 do Výzvy č. 3; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 03 05 04 ze dne 25. 4. 2013, vydáno Potvrzení města, na CRR podáno dne 14. 5. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08897; stav projektu k 31. 12. 2013: ukončení projektu 30. 11. 2013.
3. **IPRM – Sídliště Staré Město, Regenerace bytového domu Jezdecká 322/14, 405 02 Děčín 3** – předložen na město dne 7. 11. 2012; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 12 10 06 04 ze dne 13. 12. 2012, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08981, projekt byl žadatelem stažen.

V roce **2013** byly předloženy na město Děčín do Výzvy č. 2 další 4 projekty:

1. **Rekonstrukce vnitřních rozvodů a výměna výtahů BD Žerotínova 357/48, Děčín** – předložen na město dne 18. 1. 2013; schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 02 06 07 ze dne 28. 3. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08811, ukončení projektu 30. 6. 2014.
2. **Modernizace výtahů a vnitřní elektroinstalace ve společných prostorách Jezdecká 326, 327, 328, Děčín** – předložen na město dne 11. 2. 2013 – schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 02 06 08 ze dne 28. 3. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08812, ukončení projektu 30. 6. 2014.
3. **Modernizace výtahů Jezdecká 337/3, 338/5, 339/7, Děčín** – předložen na město dne 11. 2. 2013 – schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 02 06 08 ze dne 28. 3. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08810, ukončení projektu 31. 7. 2014.
4. **Modernizace výtahů bytového domu Jezdecká 323/20, 324/22, 325/24, Děčín** – předložen na město dne 11. 2. 2013, vráceno žadateli pro překročení zbylé alokace ve Výzvě č. 2.

a do Výzvy č. 3 další projekty:

1. **Rekonstrukce bytového domu Žerotínova 198 Děčín** – předložen na město dne 11. 3. 2013, schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 03 05 04 ze dne 25. 4. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08923, ukončení projektu 15. 11. 2013.
2. **Rekonstrukce a modernizace výtahu v bytovém panelovém domě Příčná 352/8, Děčín 3** – předložen na město dne 11. 3. 2013, pro nedostatek fin. prostředků ve Výzvě č. 3 ze dne 28. 2. 2013 bylo vráceno žadateli.

3. **Rekonstrukce plynovodu a otvorových výplní domu Rakovnická 358/37, 359/39 a 360/41, Děčín** – předložen na město dne 11. 3. 2013, pro nedostatek fin. prostředků ve Výzvě č. 3 ze dne 28. 2. 2013 bylo vráceno žadateli.
4. **Rekonstrukce plynovodu a otvorových výplní domu Rakovnická 358/37, 359/39 a 360/41, Děčín** – předložen na město dne 9. 4. 2013, schváleno usnesením zastupitelstva města dne č. ZM 13 04 04 01 ze dne 23. 5. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09036, ukončení projektu 23. 8. 2014.
5. **Modernizace výtahů bytového domu Jezdecká 323/20, 324/22, 325/24, Děčín** – předložen na město dne 23. 4. 2013, schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 05 06 03 ze dne 27. 6. 2013, , reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09136, ukončení projektu 9. 11. 2014, ŽOP byla podána dne 4. 12. 2014 na CRR, následně byly do 19. 12. 2014 doplněny některé údaje.
6. **Rekonstrukce a modernizace výtahu v bytovém panelovém domě Příčná 352/8, Děčín 3** – předložen na město dne 23. 4. 2013, schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 05 06 03 ze dne 27. 6. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09154, ukončení projektu 30. 4. 2014.
7. **IPRM – sídliště Staré Město, Regenerace bytového domu Březová 372/83, 373/85** – předložen na město dne 23. 4. 2013, schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 05 06 03 ze dne 27. 6. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09237, ukončení projektu 31. 12. 2014.
8. **Rekonstrukce lodžii, zateplení objektu, žadatelem je Bytové družstvo Žerotínova 355/44** – předložen na město dne 23. 4. 2013, schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 05 06 03 ze dne 27. 6. 2013, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09135, ukončení projektu 10. 10. 2014.
9. **Rekonstrukce a modernizace výtahů v bytovém domě Jezdecká 321/13, Děčín** – předložen na město dne 24. 4. 2013, z důvodu vyčerpání alokace ve Výzvě č. 3 nebyl projekt doporučen k financování.
10. **Modernizace a rekonstrukce panelového bytového domu Jezdecká 326/26, 327/28, 328/30, Děčín** – předložen na město dne 24. 4. 2013 z důvodu vyčerpání alokace ve Výzvě č. 3 nebyl projekt doporučen k financování.
11. **Rekonstrukce panelového domu Jezdecká 321/13, Děčín** – předložen na město dne 26. 4. 2013, z důvodu vyčerpání alokace ve Výzvě č. 3 nebyl projekt doporučen k financování.
12. **Snížení energetické náročnosti objektu Příčná 325/8, Děčín** – předložen na město dne 26. 4. 2013, z důvodu vyčerpání alokace ve Výzvě č. 3 nebyl projekt doporučen k financování.
13. **Modernizace výtahů Příčná 6** – předložen na město dne 29. 4. 2013, z důvodu vyčerpání alokace ve Výzvě č. 3 nebyl projekt doporučen k financování.

Všechny projekty jsou k dnešnímu dni ve stavu: ukončeno.

**Projekty pod čarou v IPRM:**

V rámci IPRM byly zrealizovány dva projekty, které byly financovány z jiných operačních programů. Jedná se o takové projektové záměry, které zapadají do celkové strategické genese IPRM, ale mají odlišnou strukturu financování.

1. Opatření 3.2 Posílení sociální integrace - projekt „**Moderní škola – moderní trendy ve vzdělávání**“ v rámci programu "Peníze školám" (OPVaK - prioritní osa 1, oblast podpory 1.4) - zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ v celkové částce 1 596 889 Kč, dotace 100%; doba trvání projektu: 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014. Číslo projektu: **CZ.1.07/1.4.00/21.2966**, realizátor ZŠ a MŠ Brezová.
2. Opatření 4.1 Zateplení vybraných budov – projekt Energetická opatření ZŠ a MŠ Děčín III, Brezová 369/25 (OPŽP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2) - realizace úspor energie a využití odpadního tepla; v celkové částce 5 142 722 Kč; doba trvání projektu: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2015. Číslo projektu: **CZ.1.02/3.2.00/13.21310**, realizátor SM Děčín.

V rámci opatření 3.2 Posílení sociální integrace, které se týká především měkkých projektů, jež doplňují celkový rámec IPRM a jejichž realizace přispěla k naplnění základních cílů IPRM, se realizovaly další aktivity, které byly realizovány různými subjekty a vedly především k osvětě a zvýšení informovanosti místních obyvatel, byly financovány z jiných zdrojů mimo Strukturální fondy EU, proto nebyly zahrnuty v celkovém rozpočtu IPRM.

Jedná se o:

Rozvojová aktivita 3.2.2. Ekologické a environmentální přednášky, realizátor SM Děčín

Přednášky pořádali zástupci ZOO Děčín, p.o. a Městského útulku Děčín. Foto z akcí je v **Příloze č. 7**.

ZOO Děčín - besedy a ekologické aktivity pořádané v lokalitě Starého Města:

- 25. 5. 2013 hřiště ŘEZUS - Den dětí, prezentace se zvířaty, besedy, soutěže
- 31. 5. 2014 hřiště ŘEZUS – Den dětí, prezentace se zvířaty, besedy, soutěže
- 8. 2014 výjezd v DPS Brezová – ukázka kontaktních zvířat + beseda se seniory

Městský útulek - besedy a ekologické aktivity pořádané v lokalitě Starého Města:

Besedy: účel je preventivní a osvětový. Učí děti i dospělé co dělat při kontaktu s cizím psem na ulici, aby nedocházelo k úrazům, jak pečovat o svá zvířata, jak se k nim chovat, vysvětlují význam a poslání útulků, co je týrání zvířat, zákon na ochranu zvířat, apod.

Výcvikové kurzy: jsou pro občany z DC a okolí. Náplní kurzu je zlepšení soužití mezi psem a člověkem, zlepšení komunikace mezi nimi, výcvik ovladatelnosti pro bezproblémové soužití ve městech a ve vztahu ke spoluobčanům.

Venčení: z DC III dochází velká část lidí - hlavně děti. Náplní je především smysluplnější využití volného času dětí z panelové zástavby, které tím zároveň pomáhají opuštěným zvířatům. Probíhá celoročně 7 dní v týdnu.

Do osvěty se dá zařadit i veřejné očkování, při kterém probíhá komunikace s občany, dotazují se na řadu věcí ve vztahu k ochraně zvířat i ochraně životního prostředí (zeleň, rostlinka, nepořádek, ...).

Konkrétní aktivity:

r. 2009:

veřejné očkování – DC III je každoročně v září

1 x výcvikový kurz – na útulku

22.10. beseda v ZŠ Brezová

2.11. beseda I. stupeň ZŠ Brezová

5.11. beseda II. stupeň ZŠ Brezová

r. 2010:

veřejné očkování

4 x výcvikový kurz

r. 2011:

veřejné očkování

2 x výcvikový kurz

27.4. beseda pro MŠ Rakovnická

26.6. beseda pro MŠ Rakovnická

28.11. beseda pro ZŠ Březová

29.11. beseda pro ZŠ Březová

30.11. beseda pro ZŠ Březová

r. 2012:

veřejné očkování

1 x výcvikový kurz

19.5. beseda pro ŠD Děčín III

23.5. beseda pro ŠD Děčín III

r. 2013:

veřejné očkování

3 x výcvikový kurz

21.10. beseda pro ZŠ Březová

20.11. beseda pro ZŠ Březová

4.12. beseda pro MŠ Rakovnická

r. 2014:

veřejné očkování

17.1. beseda pro školní parlament ZŠ Březová

3.2. beseda pro ZŠ Březová

4.12. beseda v MŠ Rakovnická



Rozvojová aktivita 3.2.3. Nabídka využití volného času pro mládež bydlící v městské části Děčín III – Staré Město, realizátor SM Děčín

V rámci náboru HC Děčín (Hokejový klub Děčín) konaly různé aktivity. Letáček a fotky z náborových akcí, které se uskutečnily v ZŠ Březová na území IPRM a na Zimním stadionu Děčín, který je v bezprostřední blízkosti, jsou v **Příloze č. 7**. Nábor HC Děčín probíhá každoročně. V uplynulém období proběhly na ZŠ Březová kromě jiných ve dnech 20.11.2013, 17.9.2014, 9.11.2015.

Rozvojová aktivita 3.2.4. Informační kampaň prevence krádeží a trestných činů, realizátor SM Děčín - Přednášky městské policie, kterými se v rámci IPRM zabývali dva určené strážníci, kteří v průběhu let 2010 a 2011 uskutečnili celkem 115 hodinových přednášek v lokalitě Staré Město. Přednášková činnost byla intenzivněji zaměřena na **Základní školu v DC III**, kde strážníci provedli celkem **86 přednášek** pro všechny ročníky (v průběhu října – prosince 2010 a února – června 2011). Tematicky přednášky zahrnují zejména trestnou činnost páchanou mládeží a trestnou činnost páchanou na dětech, možnosti ochrany před trestnou činností, postupy při zjištění trestné činnosti apod. Přednášková činnost pokračuje i v současné době.

S ohledem na rostoucí počet trestných činů zaměřených na seniory byly zbývající přednášky uskutečněny v tamním **Klubu seniorů**. Tematicky se věnovaly zejména možnostem ochrany před trestnou činností, popisu typických postupů pachatelů trestných činů i jednání, které sice nemá znaky trestného činu, ale ve vztahu k seniorům se může jednat o nemorální nátlakové jednání (prodejní předváděcí akce s předraženým zbožím apod.). Foto z akcí je v **Příloze č. 7**.

Městská policie dále zrealizovala ve spolupráci s Policií České republiky projekt menšího rozsahu, jehož obsahem byly informace o možnostech ochrany před trestnou činností zaměřenou na problematiku krádeží a vloupání do motorových vozidel. Konkrétně šlo o **Informační kampaň realizovanou formou distribuce letáků řidičům** na území Děčína III. V lokalitě bylo distribuováno celkem **2 100 letáků** ve třech vlnách (červen – červenec 2010, prosinec 2010 a červen – červenec 2011). Leták je v **Příloze č. 7**.

Publicita IPRM jako celku:

Informovanost veřejnosti byly zajišťovány prostřednictvím Portálu IPRM, který v současné době z důvodu zastarání již nefunguje, dále na webových stránkách města v aktualitách – tiskové zprávy a v sekci **PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN** (<http://mmdecin.cz/obcan/mesto/projekty-mesta-decin>) a prostřednictvím Zpravodaje – 14ti deník, který je zdarma distribuován do všech domácností ve městě, dále v tisku např. Děčínském deníku apod.

Na Portále IPRM byly zveřejněny veškeré dokumenty a informace týkající se IPRM (základní dokument IPRM a jeho aktualizace, vyhlášené výzvy, veřejná projednání, vše o ŘV IPRM, jeho členech a zasedáních, obsahy jednotlivých jednání ŘV, novinky, tiskové zprávy, prázdný projektový list, ...).

Informace o vyhlášených výzvách v rámci IPRM (5.2a) byly vyvěšeny na úřední desce Magistrátu města Děčín a dále na elektronické úřední desce Magistrátu města Děčín (http://www.mmdecin.cz/uredni_deska).

Manažerka IPRM se průběžně účastní jednání na domovních schůzích vlastníků bytových jednotek, společenství vlastníků jednotek domů a členů bytových družstev se záměrem vysvětlit projekt IPRM podrobně a zodpovědět konkrétní dotazy.

Informace o konání zasedání zastupitelstva města a návrh programu jeho jednání jsou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek města, sekce Zprávy z radnice a na úřední desce magistrátu města (i elektronické).

Publicita v r. 2015 (Příloha č. 6 této ZMZ):

1. Web města:

o Aktuality - tiskové zprávy:

- 8. července 2015, Revitalizace Starého města bude pokračovat

- 1. prosince 2015, 4. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré město

- o **sekce PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN:**

IOP – Integrovaný operační program
<u>IPRM - 1. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město</u> <u>IPRM - 2. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město</u> <u>IPRM - 3. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město</u> <u>IPRM - 4. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město</u> <u>IPRM - Individuální projekty z aktivity Regenerace bytových domů</u>

OP ŽP - Operační program životního prostředí
MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů

2. Zpravodaj města Děčín:

- 17. ledna 2015 – Zpravodaj 1/2015, str. 3 – JESSICA slaví úspěch aneb na Starém Městě neváhejte
- 3. července 2015 – Zpravodaj 13/2015, str. 7 – Obnova sídliště na Starém Městě pokračuje i o prázdninách

3. Děčínský deník:

- 10. března 2015, Bagry znovu vyjedou na Staré Město, začít má další etapa

4. Dále byl tento IPRM prezentován na veřejných jednáních zastupitelstva města a to:

- 1. zasedání ZM ze dne 29.1.2015

- č. usnesení ZM 15 01 07 02 – zastupitelstvo města projednalo změny Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město

- 3. zasedání ZM dne 26.3.2015

- č. usnesení ZM 15 03 04 01 – zastupitelstvo města projednalo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré město ke dni 31. 12. 2014 a tuto schvaluje.

- 4. zasedání ZM dne 23.4.2015

- č. usnesení ZM 15 04 05 10 – zastupitelstvo města projednalo informaci o předložení projektu „4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“.

5. Princip:

- 4. 6. 2015 – Co se staví a bude stavět?
- 3. 12. 2015 – Akce připravené v minulém období (např. projekty IPRM, hrazeno z dotace), schváleno jejich dofinancování a realizace: 4. Část revitalizace sídliště Děčín III – Staré město

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Realizace IPRM byla úspěšná. Celkem bylo zrealizováno 26 projektů, z toho 4 projekty města v Oblasti podpory 5.2 a) a 22 projektů soukromých vlastníků bytových objektů v Oblasti podpory 5.2 b). Sídliště získalo pěkný vzhled a účelné využití – dětská hřiště, sportoviště, parkovací plochy – nárůst.

Obyvateli sídliště je současný stav hodnocen kladně.

Závěr: Projekty v rámci IPRM pomohly sídlišti Staré Město odstranit nevzhlednost a negativní vlivy z minulosti a zastaralosti výstavby a naopak pomohly zpříjemnit kvalitu života na sídlišti.

V rámci IPRM došlo také zateplení mateřské školy v ul. Rakovnická, která organizačně spadá pod ZŠ a MŠ Březová a proběhla realizace několika měkkých projektů – popsáno výše, které měly pozitivní vliv na poučení obyvatel a vzdělávání dětí v ZŠ Březová.

5. ZHODNOCENÍ CELKOVÉHO KONTEXTU REALIZACE IPRM V RÁMCI MĚSTA, REGIONU

Městu Děčín přinesla realizace tohoto IPRM zkvalitnění života obyvatel jednoho z 6ti panelových sídlišť. Jeho obyvatelé výsledek revitalizace hodnotí velmi kladně. Ostatní sídliště ve městě plánuje město Děčín postupně také revitalizovat.

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů:

Hned v počátku realizace IPRM docházelo ke zpoždění přípravy projektů:

- u **oblasti podpory 5.2a)** se čekalo u projektu Revitalizace veřejných prostranství na vydání stavebního povolení a zpracování prováděcí dokumentace stavby.

Vedení města rozhodlo vyčkat s realizací projektu Revitalizace veřejných prostranství na realizaci projektů vlastníků soukromých objektů, aby město mělo jistotu dodržení poměru výdajů 55/45 uvedeného v Dohodě. Vlastníci objektů byli s přípravou svých projektů ve velkém zpoždění, docházelo k posunu realizace některých plánovaných projektů do dalších let. Někteří vlastníci z projektu IPRM vystoupili.

U projektu 2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město nebylo možné pro příliš dlouhé schvalovací procesy na CRR Chomutov projekt zrealizovat z plánované alokace roku 2011. Žádost o dotaci podaná na CRR Chomutov dne 24. 6. 2011 nebyla ani v listopadu 2011 přes telefonické i písemné urgencye zadministrována. CZV tohoto projektu byly 7 780 000 Kč. Tato částka byla městu, spolu s další nevyčerpanou částí alokace 2011, v souladu s uzavřenou smlouvou z IPRM odebrána. Vzhledem k časovému posunu realizace projektu reg. č. CZ.1.06/5.2.00/07.08481, muselo dojít i k posunu realizace projektu 3. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město a to především z důvodu dopravní obslužnosti sídliště, která by v případě realizace obou projektů najednou nemohla být zachována.

- u **oblasti podpory 5.2b)** vlastníci čekali na novelu o vlastnictví bytů, případně na vydání metodiky, která jim byla ze strany MMR slíbena na jednání předsedů družstev koncem roku 2009. Přes polovinu bytových objektů na sídlišti bylo ve vlastnictví SBD Zelená ul. a uvedený problém se jich nejvíce týkal. Ostatním jednotlivým vlastníkům bránila v podání projektu přílišná administrativní složitost přípravy projektů. Vlastníci byli s přípravou svých projektů stále ve zpoždění, což zdůvodňovali kromě administrativní složitosti přípravy projektů i nejednotností jejich názorů při schvalování obsahu a výše finanční částky projektů, vzetí úvěru na předfinancování, atd. Situaci také komplikovala skutečnost různého vlastnictví v bytových domech, část vlastníků byla členy bytového družstva a část soukromí vlastníci. Tím stále docházelo k posunu realizace některých plánovaných projektů do dalších let. Město Děčín bohužel nebylo vlastníkem žádného bytového domu ve vymezené zóně IPRM.

Z důvodu zpožděných realizací projektů docházelo k průběžnému snižování alokace v IPRM. Zpoždění v realizaci však nemělo vliv na neplnění cílů IPRM.

Ze spolupráce subjektů činných v realizaci IPRM je možné konstatovat, že komunikace byla nastavena optimálním způsobem, k čemuž také především pomáhali fungující webové stránky s aktuálními informacemi pro žadatele. V rámci zasedání ŘV IPRM, kde jsou přítomni i zástupci bytových družstev a SVJ, byla komunikace nastavena velmi dobře a při jednáních docházelo ke konsensu.

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů:

V rámci nastavení optimální komunikace mezi jednotlivými potencionálními předkladateli projektů, SM Děčín, CRR, pobočka Chomutov a pobočkou MMR v Chomutově byl uspořádán v r. 2009 informační workshop pro žadatele, jehož cílem bylo úvodní seznámení s metodikou předložení projektů. Dále se konalo veřejné projednání projektu Revitalizace veřejných prostranství na Starém Městě.

V měsíci březnu 2010 byl za účasti primátora města svolán další informační seminář pro žadatele, kde byl opětovně a závazně zjištěn skutečný zájem o realizaci projektů v oblasti podpory 5.2b) z IOP na základě přesného uvedení současné fáze přípravy projektů, přesné výše realizačních nákladů a konkrétních termínů realizace.

Město Děčín zvýšilo komunikaci s vlastníky bytových objektů ve vymezené zóně IPRM prostřednictvím Zpravodaje města, ve kterém byla v roce 2011 provedena informační kampaň a představen hotový projekt Veřejného prostranství. S CRR, pobočka Chomutov, město uspořádalo další informační workshop pro žadatele, jehož cílem bylo opětovně seznámení s metodikou předložení projektů.

Město v r. 2011 vytvořilo Portál IPRM, jehož prostřednictvím byli občané informováni o průběhu realizace IPRM.

Probíhala průběžná konzultace s vlastníky bytových domů.

7. HARMONOGRAM UKONČENÍ AKTIVIT IPRM

Období realizace:	Od:	01/06/2015	do:	30/11/2015
Popis aktivity IPRM:				
Realizace projektu „4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město“, reg. č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09772.				
Období realizace:	Od:	01/01/2009	do:	31/12/2016
Popis aktivity IPRM:				
Předložení závěrečné MZ v termínu do 12. 7. 2016. Kurz pro ZZR je 27,-- Kč.				

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny:		
Nepodstatné změny v monitorovacím období byly řešeny formou Oznámení o změně:		
<p>1. Oznámení o změně č. 2 ze dne 24. 8. 2009 bylo vypracováno v souvislosti s vyhlášením výzev v obou oblastech podpory. Změny byly následující: Zjednodušení administrativního procesu hodnocení projektů v oblasti podpory 5.2 a), Změny systému bodového hodnocení u projektů v oblasti podpory 5.2 b), Změny způsobu vyvěšení výzev na úřední desce MMD a Změna formálního potvrzení výběru projektu v rámci oblasti podpory 5.2 b) IPRM Děčín. Oznámení o změně č. 2 schválil ŘV IPRM dne 11. 08. 2009, RM Děčín usnesením č. RM 09 16 36 01 ze dne 14. 08. 2009 a ZM Děčín usnesením č. ZM 09 07 03 01 ze dne 24. 08. 2009. Oznámení o změně č. 2 bylo podáno na ŘO dne 25. 08. 2009. Veškeré změny dokumentu IPRM Děčín – sídliště Staré Město se týkají kapitoly č. 12.2.1 Sběr projektových námětů na úrovni SM Děčín (str. 60 – 65 a Tabulka č. 35 na str. 97 - 98). Tabulka č. 35 na str. 97 je zcela vypuštěna.</p>		

2.	Výměna projektu pod čarou - v Opatření 3.2 Posílení sociální integrace - projekt Podpora výuky přírodovědných předmětů a anglického jazyka na základní škole (z OPVaK ve výši 695 800 Kč) - pro tento projekt nebyl vypsán prozatím vhodný dotační titul, proto se škola zapojila do jiného projektu a to "Peníze školám" (také do OPVaK - prioritní osa 1, oblast podpory 1.4) - zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ v celkové částce 1 596 889 Kč; číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2966; doba trvání projektu: 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014, závěrečná monitorovací zpráva byla odevzdána v dubnu 2014 a následně schválena. V červnu 2014 došlo k finančnímu uzavření celého projektu.
3.	Oznámení o změně č. 3 ze dne 03. 07. 2011 - zařazení nového projektu „pod čarou“ s názvem „PODPORA – program poradenství a dalšího vzdělávání pro nezaměstnané z lokality Děčín“, který podávalo do OP LZZ OMNI TEMPORE o.p.s. (projektový manažer Mgr. Viktor Koláček). Schváleno ŘO dne 8. 8. 2011
4.	Oznámení o změně č. 4 ze dne 01. 10. 2012 – úprava alokace Výzvy č. 1. Schváleno ŘO dne 19. 7. 2012.
5.	Oznámení o změně č. 5 ze dne 20. 12. 2012 – úprava termínu ukončení kontinuální Výzvy č. 2. Schváleno ŘO dne 19. 12. 2012.
6.	Oznámení o změně č. 6 ze dne 28. 03. 2013 – implementace FN JESSICA. Schváleno ŘO dne 18. 06. 2013.
7.	Oznámení o změně č. 7 ze dne 26. 03. 2015 – změna statutárního zástupce města. Schváleno ŘO dne 20. 2. 2015.

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Podstatné změny v monitorovacím období byly řešeny formou Oznámení o změně:		
1. Oznámení o změně č. 1 ze dne 28. 05. 2009 – změna byla vypracována v souvislosti s Rozhodnutím ministra o schválení IPRM, kdy bylo nutné zkrátit celkový rozpočet IPRM a úměrně této skutečnosti krátit monitorovací indikátory. Oznámení o změně č. 1 schválil ŘV IPRM dne 22. 05. 2009, RM Děčín dne 26. 5. 2009 a ZM Děčín dne 28. 05. 2009. Stav řešení změny byl podrobně popsán v oznámení. Oznámení o změně č. 1 bylo podáno na ŘO dne 26. 06. 2009.		
Dohoda o schválení IPRM vypracována a podepsána ze strany nositele IPRM		Ano
Datum podpisu Dohody nositelem IPRM:	25/06/2009	
Dohoda o poskytnutí dotace podepsána ze strany ŘO		Ano
Datum podpisu Dohody ŘO:	03/07/2009	

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
2. Ze strany ŘO došlo ke změně v Dohodě – v čl. 3 „Povinnosti města“ se v odst. 2 slova „- do 31. 12. 2010 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpano nejméně 13 % celkových způsobilých výdajů IPRM,“ vypouští.		
Dodatek č. 1 k Dohodě o schválení IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		Ano

Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:	05/01/2011
Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO	Ano
Datum podpisu Dodatku ŘO:	04/02/2011

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
3. V monitorovacím období 1. 9. 2009 – 31. 12. 2011 nebyly čerpány finanční prostředky v souladu s uzavřenou Dohodou o zabezpečení realizace IPRM, článek 3, bod 2 (do 31. 12. 2011 prostřednictvím musí být vyčerpáno nejméně 25% celkových způsobilých výdajů IPRM). Uzavřením dodatku došlo ke snížení CZV IPRM a k tomu odpovídajícímu snížení monitorovacích indikátorů výsledku.		
Dodatek č. 2 k Dohodě o schválení IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		Ano
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:	01/06/2012	
Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO		Ano
Datum podpisu Dodatku ŘO:	18/07/2012	

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
4. V monitorovacím období 1. 9. 2009 – 31. 12. 2012 nebyly čerpány finanční prostředky v souladu s uzavřenou Dohodou o zabezpečení realizace IPRM, článek 3, bod 2 (do 31. 12. 2011 prostřednictvím musí být vyčerpáno nejméně 40% celkových způsobilých výdajů IPRM). Uzavřením dodatku došlo ke snížení CZV IPRM a k tomu odpovídajícímu snížení monitorovacích indikátorů výsledku.		
Dodatek č. 3 k Dohodě o schválení IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		Ano
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:	28/06/2013	
Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO		Ano
Datum podpisu Dodatku ŘO:	21/08/2013	

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
5. V monitorovacím období 1. 9. 2009 – 31. 12. 2013 sice nebyly čerpány finanční prostředky v souladu s uzavřenou Dohodou o zabezpečení realizace IPRM, článek 3, bod 2 (do 31. 12. 2011 prostřednictvím musí být vyčerpáno nejméně 67% celkových způsobilých výdajů IPRM), ale vlivem změny měnového kurzu po intervenci ČNB v alokaci 5.2 došlo uzavřením dodatku k navýšení CZV IPRM.		



Dodatek č. 4 k Dohodě o schválení IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		Ano
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:	03/06/2014	
Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO		Ano
Datum podpisu Dodatku ŘO:	24/07/2014	

10. SPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Plocha revitalizovaného území	m ²	84 741	137 956,12	
Počet regenerovaných bytů	počet	80	1 263	
Úspora spotřeby energie	%	10	31,12	
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				
Monitorovací indikátory IOP celkem				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Plocha revitalizovaného území	m ²	84 741	137 956,12	
Počet regenerovaných bytů	počet	80	1 263	
Úspora spotřeby energie	%	10	31,12	
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				

Monitorovací indikátory za jiné OP				
Monitorovací	Měrná	Plánovaná	Dosažená hodnota	Poznámka

indikátor	Jednotka	hodnota dle Dohody		
Počet nových služeb	počet	3	2	Projekt „Moderní škola – moderní trendy ve vzdělávání“ v rámci programu "Peníze školám" (OPVaK - prioritní osa 1, oblast podpory 1.4) Energetická opatření ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Počet projektů	počet	1	2	dtto
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				
V Dohodě nebyly tyto projekty vůbec uvedeny. Zrealizovány z jiných OP byly dva projekty uvedené ve sloupci Poznámka. Projekt odpadového hospodářství nebyl zrealizován z původně uvažovaného OPŽP, ale z IOP, neboť byl součástí projektu regenerace sídliště - oblast podpory 5.2 a), proto jej zde neuvádíme.				
Počet plánovaných projektů byl oproti plánu (1) překročen o jeden (2).				

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Principy rovných příležitostí jsou respektovány v rámci celého IPRM, a to v rozsahu, který odpovídá zaměření jednotlivých dílčích projektů. Skutečné naplnění tohoto horizontálního tématu bylo realizováno prostřednictvím dílčích projektů financovaných z jednotlivých zdrojových operačních programů, jejichž věcná i formální konstrukce respektovala stanovená horizontální témata v rozsahu odpovídajícím jejich poslání. V této souvislosti byly jednotlivé dílčí projekty posuzovány a hodnoceny ŘO zdrojových operačních programů jak ve fázi podání žádosti o finanční podporu, tak ve fázích realizace a hodnocení udržitelnosti.

Žádný projekt v rámci IPRM neomezoval rovné příležitosti, tzn., že byl umožněn přístup všech dotčených obyvatel a realizace projektu neměla negativní vliv na žádnou složku obyvatelstva.

Udržitelný rozvoj:

Jedná se o ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Princip udržitelného rozvoje zahrnuje oblasti dopravy, životního prostředí, spotřeby energie, ekonomického potenciálu a výchovy k udržitelnému rozvoji. V IPRM *Děčín – sídliště Staré Město* symbolizuje vnímání horizontálních témat globální cíl a i jednotlivé specifické cíle a opatření: Revitalizace veřejných prostranství, sanace bytových domů a zkvalitnění prostředí městské části Děčín III – Staré Město za účelem jejich zatraktivnění a oživení funkčnosti.

Principy trvale udržitelného rozvoje jsou respektovány v rámci celého IPRM, a to v rozsahu, který odpovídá zaměření jednotlivých dílčích projektů. Skutečné naplnění tohoto horizontálního tématu bylo realizováno prostřednictvím dílčích projektů financovaných z jednotlivých zdrojových operačních programů, jejichž věcná i formální konstrukce respektovala stanovená horizontální témata v rozsahu

odpovídajícím jejich posláním. V této souvislosti byly jednotlivé dílčí projekty posuzovány a hodnoceny ŘO zdrojových operačních programů jak ve fázi podání žádosti o finanční podporu, tak ve fázích realizace a hodnocení udržitelnosti.

V rámci aktivit realizovaných v IPRM byly sledovány především následující aspekty:

- **Doprava** – aktivity přispěly ke zlepšení dopravní dostupnosti sídlištní lokality a zvýšily propustnost významné tepny (silnice č. II/261) tvořící hranici lokality. Podporování vývoje směrem k veřejné dopravě (dostupnost), chůzi a cyklistice (specifický cíl č. 1);
- **Spotřeba energie** – snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů tam, kde je to možné (specifický cíl č. 4);
- **Životní prostředí** – regenerace veřejných prostranství, obnova a výsadba zeleně (specifický cíl č. 2 a 5);
- **Výchova k udržitelnému rozvoji** – v lokalitě se nachází základní škola, která v rámci učební osnovy uplatňuje principy EVVO. Na základě projektu realizovaného „pod čarou“ došlo k naplňování tohoto principu. (specifické cíle č. 1, 2, 3 a 5);
- **Ekonomický potenciál** – aktivity realizované v rámci IPRM byly zaměřeny na problémové skupiny a jejich zapojení do plánování všech projektů. Zde byl kladen důraz na zapojení místních obyvatel do realizovaných projektů. Jelikož se jednalo především o zhodnocení jejich vlastního majetku, bylo nutné veškeré aktivity konzultovat s touto specifickou skupinou.

Princip udržitelného rozvoje byl detailněji řešen u každého dílčího projektu samostatně. Protože součástí IPRM jsou investiční projekty, bylo nutné každý projekt předkládaný v rámci IPRM posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí. Veškeré stavební práce byly vykonávány tak, aby se zaměřily na omezení vzniku rizikových škodlivin (hluk, prach, znečištění vozovek a likvidace odpadů ze stavebních úprav). Stavba neovlivnila klimatické poměry, ovzduší, nekontaminovala půdu ani nenarušila stabilitu ekosystému. Projekty byly realizovány v souladu se zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 218/2004 Sb.), a č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. K opravě a stavebním úpravám byly použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Nakládání s odpady bylo řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Projekty neměly negativní vliv na životní prostředí a významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partnerem IPRM je ZŠ a MŠ Březová a vlastníci bytových objektů na sídlišti Staré Město.

Sledování doplňkového indikátoru „Počet zapojených partnerů“ nebylo v IPRM nastaveno.

Princip partnerství byl v IPRM respektován v nejširším smyslu pojmu a právo partnerů ucházet se o finanční podporu ve volné soutěži všech uchazečů. Partneri IPRM však byli vedeni k zařazení reálných projektových záměrů, jejichž podstata odpovídá strategickým cílům IPRM, komplexnosti a synergickým efektům jejich působení a zároveň k efektivnosti, financovatelnosti a udržitelnosti v čase. Finanční model počítá u aktivit 5.2a) s **85%** dotací a u aktivit 5.2b) s **40%** dotací.

Čerpání Celkových způsobilých výdajů IPRM bylo od počátku (v Dohodě) nastaveno:

- a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství: 55 %
- b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů: 45 %

Město hned v počátku přípravy IPRM navázalo komunikaci a partnerskou spolupráci se zástupcem ZŠ a MŠ Březová a všemi vlastníky bytových objektů na sídlišti Staré Město. Přílohou č. 12 Žádosti k IPRM byl indikativní seznam 26 projektů (v **Příloze č. 5**), z nichž pouhých 6 jich mělo být realizováno městem, 2 projekty měla realizovat ZŠ a MŠ Březová, a dalších 18 projektů vlastníci bytových objektů.

Do tohoto indikativního seznamu projektových záměrů a dílčích projektů IPRM určených pro realizaci byly v rámci zachování rovných příležitostí zařazeny všechny projekty partnerů IPRM, jejichž obsah byl v souladu s vymezenou zónou města IPRM a vyhověl strategickému rámci IPRM (cíle, opatření,

aktivity).

V rámci IPRM bylo nakonec realizováno 26 projektů z IOP, z toho 4 projekty města v Oblasti podpory 5.2 a) a 22 projektů soukromých vlastníků bytových objektů v Oblasti podpory 5.2 b).

Dalším realizovaným projektem byl projekt ZŠ a MŠ Březová „Moderní škola – moderní trendy ve vzdělávání“ (v rámci programu "Peníze školám") z OPVaK, tzv. projekt „pod čarou“.

ŘV IPRM je složen ze zástupců města, partnerů, členů bez hlasovacího práva a je sestaven na základě principu partnerství. Dosud jsou členy dva zástupci partnerů, vlastníků bytových objektů, RNDr. Lubomír Paroha, soukromý vlastník objektu, a Ing. Jiří Chára, ředitel SBD Děčín, Zelená ul.

Partneři diskutovali v průběhu přípravy i realizace IPRM se zástupci města přípravu svých projektů a informovali průběžně o jejich stavu.

Způsoby komunikace:

- **Webové stránky města Děčín** – www.mmdecin.cz – stěžejní komunikační kanál – slouží k poskytování základních informací o IPRM, byly zde zveřejňovány aktuální informace o realizaci IPRM a dílčí podmínky vyhlášených výzev k sběru projektů do IPRM.
- **Přímá komunikace** – prostřednictvím e-mailu, dopisů odborníků a pracovníků odboru rozvoje MM Děčín zejména při dotazování se občanů, osobní konzultace.
- **Zpravodaj „Město Děčín – zpravodaj“** – informoval především o přípravě a realizaci IPRM, o postupech realizace dílčích projektů, konání seminářů a veřejných projednávání IPRM.
- **Semináře pro veřejnost** - v rámci připravované výzvy k předkládání projektů do IPRM bylo nutné veřejnost informovat o záměrech a možnostech řešení a zaměření konkrétních projektů.
- **Projednávání IPRM** na veřejném zasedání Zastupitelstva města Děčín.
- **Neformální „nepřímá“ komunikace** – využití kontaktů a komunikačních kanálů jednotlivých partnerů města v rámci IPRM a dalších zapojených subjektů.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů: (Kč)	EU	81 389 638,61
	SR	3 870 145,01
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů: (Kč)	EU	69 249 349,48
	SR	3 786 953,49

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Závěrečné zprávě o realizaci IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM byl realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby:*	Mgr. Marie Blažková
Funkce:	Primátorka města
Místo a datum:	Děčín 1. 7. 2016
Podpis a razítko
Poznámky	

* Pokud Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o realizaci IPRM* (<i>viz poznámka výše</i>)	NE
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>)	ANO
3	Doklady o schváleném výběru projektů IPRM v jednotlivých výzvách aktivit.	ANO
4	Seznam projektů pod čarou	ANO
5	Partnerství	ANO
6	Publicita za rok 2015	ANO
7	Ostatní	ANO
8	Seznam projektů pro 5.2 Děčín	ANO

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)									Nezpůsobilé výdaje
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
Oblast intervence/aktivita										
5.2.a)	0	0	0	10 552 818	0	21 532 573,38	28 452 691,93	16 438 479,98	56 223 436,54	6 749 919,43
5.2.b)	0	0	3 394 962	4 664 900	5 198 526	21 404 906	28 452 691,93	0	63 115 985,93	0
5.2.c)										
Způsobilé výdaje celkem									119 339 422,47	
Nezpůsobilé výdaje celkem										6 749 919,43
IPRM celkem										126 089 341,9

Seznam Potvrzení o výběru projektu

č.	Rok vydání	Název projektu	Unikátní kód žádosti	Usnesení Zastupitelstva města Děčín	Poznámka
1	2010	Rekonstrukce bytového panelového domu Jezdecká 321/13, Děčín	14Xm5P0002	ZM 10 04 04 03	
2	2010	Rekonstrukce bytového panelového domu Žerotínova 357/48, Děčín	16g8QP0002	ZM 10 04 04 03	
3	2010	Modernizace výtahů	0Zw7NP0002	ZM 10 06 06 05	
4	2011	1. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	1AqpP0001	ZM 11 06 03 03	
5	2011	2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	1KU83P0001	ZM 11 06 03 03	Dlouhým schvalovacím procesem na CRR Chomutov došlo k posunu VR na zhotovitele stavby a tím k posunu termínu realizace tak, že dokončení stavby přesáhlo původně plánovaný maximální termín 30. 9. 2011. Proto realizace projektu musela mít vyřazena z alokace r. 2011. Projekt byl znovu podán v roce 2012.
6	2011	Modernizace výtahů	1Bt64P0001	ZM 11 04 05 10	
7	2011	Rekonstrukce vnitřní splaškové kanalizace	1Bu3PP0002	ZM 11 04 05 10	
8	2011	Rekonstrukce a modernizace společných prostor objektu	1Bu3UP0001	ZM 11 04 05 10	
9	2011	Ústřední topení	1CSWIP0001	ZM 11 04 05 10	
10	2011	Rekonstrukce vodovodní přípojky	1Bu70P0001	ZM 11 04 05 10	
11	2011	Rekonstrukce bytového panelového objektu Jezdecká 337/3, 338/5, 339/7, Děčín	1Fmh4P0001	ZM 11 06 03 04	
12	2011	Rekonstrukce a modernizace osobního výtahu v panelovém domě Příčná 352/8, Děčín	1AQ16P0001	ZM 11 06 03 04	
13	2012	2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	2 Hz XVP0001	ZM 12 09 03 02	Projekt z roku 2011, který byl v roce 2011 stažen.
14	2012	Regenerace bytového domu Rakovnická 196, Děčín 3 - Staré Město	20hLuP0001	ZM 12 02 04 09	
15	2012	Děčín-Staré Město, Oblouková 374 - zateplení budovy, výměna výplní, rekonstrukce výtahů	20N5BP0002	ZM 12 02 04 16	
16	2012	Rekonstrukce plynovodu – bytový dům Rakovnická 307/21 a 308/23, Děčín 2	1ZIP50001	ZM 12 07 06 01	Změna právní subjektivity žadatele – nepodáno na CRR, projekt opět podán do Výzvy č. 3 v roce 2013.
17	2012	IPRM – Sídlíště Staré Město, Regenerace bytového domu Jezdecká 322/14, 405 02 Děčín 3	21YSYP0001	ZM 12 10 06 04	
18	2013	3. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	31bc3P0001	ZM 13 06 05 06	
19	2013	Rekonstrukce vnitřních rozvodů a výměna výtahů BD Žerotínova 357/48, Děčín	2QBee0001	ZM 13 02 06 07	
20	2013	Modernizace výtahů Jezdecká 337/3, 338/5, 339/7, Děčín	2UCgLP0001	ZM 13 02 06 08	
21	2013	Modernizace výtahů a vnitřní elektroinstalace ve společných prostorách Jezdecká 326, 327, 328, Děčín	2U1LuP0001	ZM 13 02 06 08	
22	2013	Rekonstrukce plynovodu – bytový dům Rakovnická 307/21 a 308/23, Děčín 2	1ZIP5P0003	ZM 13 03 05 04	Projekt z roku 2012, u kterého se změnila právní subjektivita žadatele.
23	2013	Rekonstrukce bytového domu Žerotínova 198 Děčín	226FuP0002	ZM 13 03 05 04	
24	2013	Rekonstrukce plynovodu a otvorových výplní domu Rakovnická 358/37, 359/39 a 360/41, Děčín	2vFckP0002	ZM 13 04 04 01	
25	2013	IPRM – sídlíště Staré Město, Regenerace bytového domu Březová 372/83, 373/85	34HaEP0001	ZM 13 05 06 03	
26	2013	Modernizace výtahů bytového domu Jezdecká 323/20, 324/22, 325/24, Děčín	2wwwEP0001	ZM 13 05 06 03	
27	2013	Rekonstrukce a modernizace výtahu v bytovém panelovém domě Příčná 352/8, Děčín 3	2pkIP0003	ZM 13 05 06 03	
28	2013	Rekonstrukce lodžii, zateplení objektu	34FP0p0001	ZM 13 05 06 03	
29	2015	4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	3NriDP0001	ZM 15 04 05 10	

Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)					
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace
„Moderní škola – moderní trendy ve vzdělávání“ (v rámci programu „Peníze školám“)	ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25, příspěvková organizace Statutárního města Děčín	OP VaK / 1.4.	1 596 889 Kč / 1 596 889,- Kč	v rámci RMZ č. 2 (za rok 2010)	1. 9. 2011 - 28. 2. 2014
Energetická opatření ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	Statutární město Děčín	OPŽP / 3.2	3 354 574 Kč / 5 142 722 Kč	v rámci žádosti	1. 5. 2015 – 31. 10. 2015

Členové Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město ode dne 29.01.2015

Členové ŘV:

s právem hlasovacím:

1. Ing. Valdemar Grešík, 3. náměstek primátorky, předseda ŘV,
2. Mgr. Petr Kužel, vedoucí OR MM Dc, místopředseda ŘV,
3. Pavel Sinko, člen ZM,
4. Ing. Hana Hlaváčková, vedoucí OE MM Dc,
5. Mgr. Anna Zemanová, odborný pracovník OR MM Dc,
6. Petr Michajličenko, odborný pracovník OMH MM Dc,
7. Ing. Zdeňka Švirlochová, odborný pracovník OMH MM Dc,
8. RNDr. Lubomír Paroha, soukromý vlastník objektu,
9. Ing. Jiří Chára, ředitel SBD Děčín, Zelená ul.,
10. Mgr. Tomáš Pavlík, MBA, manažer prevence kriminality, Městská policie Děčín,

s hlasem poradním:

11. Ing. Martina Štajnerová, vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů OR MM Dc, manažer IPRM,
12. Zástupce centra pro regionální rozvoj, pobočky NUTS II Severozápad.

Příloha č. 12 - IPRM Děčín - sídliště Staré Město

Indikativní seznam projektů

Pořadí	Název žadatele	Název projektu	Operační program	Oblast intervence	Celkové náklady (v tis. Kč)	Dotace (v tis. Kč)	Doba realizace projektu
1.	Statutární město Děčín	Rekonstrukce dětských hřišť	IOP	5.2 a)	6 000	5 100	2010 - 2012
2.	Statutární město Děčín	Městská zeleň – ulice Příčná	IOP	5.2 a)	3 648	3 101	2011 - 2012
3.	Statutární město Děčín	Revitalizace veřejných prostranství sídliště Děčín 3 – Staré Město	IOP	5.2 a)	65 326	55 527	2010 - 2014
4.	Statutární město Děčín	Rekonstrukce veřejného osvětlení	IOP	5.2 a)	15 760	13 396	2010 - 2014
5.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Rakovnická 358/37, 359/39 360/41	IOP	5.2 b)	7 500	3 000	2012 - 2014
6.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Růžová 364/1, 365/3, 366/5, 367/7, 368/9	IOP	5.2 b)	5 000	2 000	2011 - 2014
7.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Žerotínova 357/48	IOP	5.2 b)	4 700	1 880	2012 - 2013
8.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Jezdecká 321/13	IOP	5.2 b)	6 300	2 520	2012 - 2014
9.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Jezdecká 326/26, 327/28, 328/30	IOP	5.2 b)	4 500	1 800	2010 - 2012
10.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Jezdecká 323/20, 324/22, 325/24	IOP	5.2 b)	6 000	2 400	2013 - 2014
11.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Oblouková 296/83, 297/85, 298/87, 299/89	IOP	5.2 b)	6 980	2 792	2012 - 2014
12.	SVJ domu Žerotínova 354/42	Rekonstrukce panelového domu - Žerotínova 354/42	IOP	5.2 b)	3 500	1 400	2010 - 2014
13.	Bytové družstvo Příčná 351/6	Rekonstrukce plynovodu	IOP	5.2 b)	1 000	40	2010
14.	Jarmila a Lubomír Parohovi	Regenerace bytového domu Kladenská 37	IOP	5.2 b)	900	360	2011 - 2012
15.	Bytové družstvo Žerotínova 355/44	Oprava balkonů, oprava fasády - Žerotínova 355/44, 405 02 Děčín	IOP	5.2 b)	1 500	600	2011
16.	Stavební bytové družstvo Děčín	Panelový dům Příčná 352/8, Děčín III	IOP	5.2 b)	5 970	2 388	2012 - 2014
17.	Bytové družstvo Žerotínova 355/44	Oprava přízemí domu a společných prostor - Žerotínova 355/44, 405 02 Děčín 3	IOP	5.2 b)	500	200	2010
18.	Společenství vlastníků jednotek domu Příčná 349/2, 405 02 Děčín III	Rekonstrukce panelového domu	IOP	5.2 b)	3 500	1 400	2010 - 2014
19.	Bytové družstvo Žerotínova 355/44, 405 02 Děčín 3	Rekonstrukce výtahů Bytové družstvo Žerotínova 355/44	IOP	5.2 b)	2 600	1 040	2010
20.	Bytové družstvo Žerotínova 355/44, 405 02 Děčín 3	Oprava vzduchotechnického zařízení domu, dodávka a montáž zařízení pro rekuperaci tepla	IOP	5.2 b)	3 500	1 400	2010
21.	SVJ domu ul. Příčná 350/4, Děčín III	Panelový dům Příčná 350/4, Děčín III	IOP	5.2 b)	3 500	1 400	2011 - 2014
22.	SVBJ Litoměřická 334, 335, 336	Zlepšení obyvatelnosti panelového domu	IOP	5.2 b)	4 550	1 820	2010 - 2012
23.	Statutární město Děčín	Zkulturnění a zatraktivnění prostředí v okolí základní školy, školní jídelny a mateřské školy, vytvoření bezpečného prostředí pro žáky a širokou veřejnost	IOP	5.2 a)	7 075	6 014	2010 - 2014
24.	ZŠ a MŠ Děčín III, Brezová 369/25	Energetická opatření ZŠ a MŠ Děčín III, Brezová 369/25	OPŽP	3.2	26 070	23 463	2010 - 2013
25.	ZŠ a MŠ Děčín III, Brezová 369/25	Podpora výuky přírodovědných předmětů a anglického jazyka na základní škole	OPVK	1.1	695,8	695,8	2011 - 2012
26.	Statutární město Děčín	Pořízení odpadových nádob na separovaný sběr odpadů	OPŽP	4.1	7 700	6 930	2011

středa, 08 červenec 2015 16:59

Revitalizace Starého Města bude pokračovat

Napsal(a) Mgr. Romana Silvarová | Rubrika: Dění ve městěEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO Váš ROZVOJProjekt "4. část –
Revitalizace
sídliště Děčín III

– Staré Město" je pokračováním komplexní obnovy jednoho z nejproblémovějších městských sídlišť. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění prostředí a oživení funkčnosti sídliště a to především prostřednictvím obnovy veřejných prostranství.

Revitalizace proběhne v ulicích Březová a části ulice Přemyslova. Mimo to budou v revitalizovaném prostoru uloženy chráničky na metropolitní síť, která bude sloužit především k napojení kamerového systému. V rámci jeho rozšíření budou na Starém Městě umístěny dva nové kamerové body. Stavba bude zahájena 1. 7. 2015 a její ukončení je v plánu v říjnu roku 2015. Celá revitalizace je součástí rozsáhlého projektu IPRM Děčín - sídliště Staré Město financovaného z Integrovaného operačního programu. Financování způsobilých výdajů projektů revitalizace veřejného prostranství je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z 15 % z vlastních prostředků města Děčín.

V případě jakýchkoli dotazů na projekt či průběh stavby se obraťte na pracovníky odboru rozvoje:

lenka.houdova@mmdecin.cz (projektový manažer), edita.jiristova@mmdecin.cz (investiční technik).

sdílet

tweet

plus

Přečteno: 584 krát

MGR. ROMANA SILVAROVÁ

vedoucí kanceláře primátora

úterý, 01 prosinec 2015 11:11

Marie Blažková: zavázali jsme se k opravám majetku městaNapsal(a) Markéta Lakomá | Rubrika: Zprávy z radnice

Vážení občané,
je to přibližně rok, co stojíme v čele města, a mnozí z Vás se ptají, co jsme udělali. Když pomínu dokončení velkých akcí bývalého vedení, je za námi spousta prací takzvaně neviditelných. Neviditelných proto, že to nejsou akce na přestřihávání pásek za účasti novinářů a politiků. Jde především o opravy a vylepšení stávajícího majetku městu a k tomu jsme se Vám zavázali. Město

není v úplně nejlepším stavu, s tím jistě souhlasíte, a proto opravy, přestože stojí statisíce a miliony, takřka nejsou vidět. Pro Vaši představu jsme připravili přehled těch největších akcí, které letos proběhly nebo na kterých pracujeme. Ve výčtu nenajdete všechny vyspravené ulice, je jich opravdu velké množství. Přesné vyčíslení oprav chodníků a silnic, mostků, propustků, opěrných zdí apod. tedy prací, po kterých lidé nejvíce volají, připravíme do nejbližšího čísla Zpravodaje a na webové stránky města.

Marie Blažková, primátorka města Děčín

Akce připravené v minulém období (např. projekty IPRM, hrazeno z dotace), schváleno jejich dofinancování a realizace:

- Rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulici - dokončení
- Zahájená a dokončená úprava okolí kolem domova pro seniory
- 4. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré město

- Revitalizace prostoru před Billou v DC I
- Rekonstrukce nádvoří – zámek
- Prostor kolem zámecké sýpky

Projektové dokumentace (PD) za účelem přípravy dalších investic (příprava na nové dotační výzvy nebo bude 100% hrazeno z rozpočtu města):

- PD na víceúčelové hřiště + skatepark v DC III
- PD na komunikační napojení průmyslové zóny v Krokově ulici, v roce 2016 nový most
- PD na revitalizaci sídliště Březiny – priorita z hlediska bezpečnosti (záchranné složky)
- PD na kanalizaci v Horním Oldřichově
- PD na Domov se zvláštním režimem (budova bývalého bowlingu v Křešicích) – priorita
- PD na revitalizaci historické části Podmokel – ul. Prokopa Holého + Husovo náměstí
- PD na řešení dopravy v historické části Podmokel

Opravy zahájené nebo dokončené (z dotací nebo z vlastního rozpočtu)

- Kanalizace Kamenická (nalezená) – PD + dílo
- Výměna oken v Domově s pečovatelskou službou Boletice
- Výměna oken v Domově s pečovatelskou službou Bynov
- Zateplení MŠ Rakovnická DC III
- Oprava mostků na Lesné (DC – 018P, a DC – 019P) – PD + veřejná zakázka + předané staveniště
- Oprava bytového domu v Tržní ul. - PD + veřejná zakázka + předané staveniště
- Oprava chlazení na zimním stadionu (výměník tepla)
- Výměna střešní krytiny Lidická 21 – havárie (bouřka)
- Rekonstrukce (strop a podlaha, osvětlení) tělocvičny ZŠ Dr. M. Tyrše - PD + veřejná zakázka + předané staveniště
- Rekonstrukce kašny v Podmoklech (památník)
- Restaurování soch – Kaple Panny Marie Pomocné
- Provedení nátěrů oblouků zimního stadionu ZS
- Výměna povrchu ve sportovní hale Maroldova (malý sál)
- Výměna mostovky Oblouková ul.
- Oprava místní komunikace Nedbalova (odvodnění)
- Zajištění skalního masivu v Prostředním Žlebu
- Zajištění skalního masivu – Šibeniční Vrch

- Oprava dešťové kanalizace v Boleticích (propadlá vozovka v sídlišti)
- Rekonstrukce opěrné zdi v Žižkově ulici – 3. etapa
- Odstraňování povodňových škod z roku 2013 (ul. 5. května – Bělá)

[sdílet](#)

[tweet](#)

[plus](#)

Přečteno: **421** krát

Naposledy změněno středa, 02 prosinec 2015 09:35



MARKÉTA LAKOMÁ

tisková mluvčí Magistrátu města Děčín

Do konce září je možné umístit osobnosti na Cenu města Děčína.

Ta je především nariadením ocenění udělovaným za zvláštní zásluhy	Waldmann, Rudolf; Feldmann, posled-
rozvoj města Děčína nebo jeho propa-	ní držitel Ceny jsou Matulena Čej-
ve České republice či v zahraničí,	ková a Karel Bělou.
nebo za výjimečnou činnost nebo dílo	Nominace mohou občané poslat do
z různých oblastech veřejného života,	konce září na adresu: Nguštrůvů město
finančních prospěchů zejména občanům	Děčín, Odbor školství a kultury, Míro-
na Cenu města Děčína nebo souměnně městu	ve nám. 117/55, Děčín IV, 405 38, nebo
Děčín, nebo majitel i celospolečens-	na e-mail: post@mmdecin.cz. Struč-
ky v roce. Poprvé byl Cenu ude-	a pravidla udělování Ceny jsou k dispo-
řena v roce 2009, kdy ji získal Josef	skosti, kultura, sport. Dokumenty
	<i>(rovně)</i>

10.3.2015 Bagry znovu vyjedou na Staré Město, začít

Děčín – Město Děčín chce letos získat dotaci na další revitalizaci staroměstského sídliště.



Na Starém Městě v Děčíně probíhá revitalizace. Autor: Deník/ A. Vanžura

Obyvatelé žijící na děčínském sídlišti na Starém Městě by měli letos počítat s dalšími omezeními. Magistrát totiž chce získat dotaci na další etapu revitalizace – ta by se tentokrát měla dotknout především Březové a Přemyslovy ulice. Jedná se o čtvrtou etapu úpravy staroměstského sídliště, která probíhá v rámci IPRM, tedy Integrovaného plánu rozvoje města.

„V rámci projektu budou rekonstruovány místní komunikace a veřejné osvětlení

_____ , dojde k pokládce chráničky metropolitní sítě a napojení a osazení dvou kamerových bodů,“ vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Zda se magistrát letos opravdu do další etapy revitalizace pustí ale ještě není jasné. V současné době je vyhlášené výběrové řízení na firmy

_____, které pro město čtvrtou etapu zrealizují. Teprve poté bude možné požádat o přidělení dotace

_____ v rámci Integrovaného operačního programu.

Podle zadávací dokumentace by celá zakázka neměla vyjít na více než necelých osmnáct milionů korun bez daně. Dotace by měla pokrýt 85 procent z investované částky.

Pokud se podaří dotaci včas získat, měla by stavební firma začít pracovat v průběhu letošního května, hotovo by pak mělo být do konce roku.

Staroměstské sídliště prochází rozsáhlou revitalizací již několik let

_____. Nejvíce kritizovaná byla rozsáhlá etapa, která kromě jiného zahrnovala rekonstrukci Obloukové ulice. Lidé ze čtyřtisícového sídliště totiž museli dlouhé měsíce skákat přes výkopy a rozkopanou silnici.

Psali jsme: Děčín: Staré Město se mění, probíhá tu revitalizace...ZDE...

Krátce poté, co bagry rozbily Obloukovou ulici, začala i rekonstrukce kanalizace a vodovodu v sousední Žerotínově ulici a průjezd sídlištěm byl tak prakticky nemožný. Problematická byla cesta

_____ přes sídliště především pro

Problematická byla cesta

přes sídliště především pro starší lidi. Cestou na autobusové zastávky totiž bylo mnohdy nutné překonat výkopy i desítky centimetrů hluboké. S rekonstrukcí sídliště a především s nasazením těžké techniky měli problémy především lidé žijící v opravované ulici.

„Jednou jsme se probudili a mysleli jsme, že je zemětřesení. Skleničky poskakovaly ve skříní, houpaly se záclony. Tak jsem se běžel podívat k oknu, co se děje. A tam velkým trnem likvidovali starou silnici,“ stěžoval si před rokem jeden z obyvatel Obloukové ulice, kterému kvůli necitlivému postupu stavařů popraskaly zdi v domě.

Původně měla být tato rozsáhlá etapa revitalizace za více než 30 milionů korun dokončena do konce roku 2013. Jenže již několik týdnů před původním termínem dokončení bylo jasné, že se jej nepodaří dodržet.

Po mnoha odkladech ale došla radnici trpělivost a stavební firmě Insky, která měla stavební práce na starosti, udělila pokutu ve výši 1,75 milionu. Ale ani to nepomohlo a druhá etapa byla dokončena s přibližně devítiměsíčním zpožděním. Město totiž nemá příliš možností, jak stavební práce urychlit a udržet odpovídající kvalitu. Pokud by například zdržovalo platby, hrozilo by, že o dotaci přijde.

To by se ale tentokrát již nemělo podle vyjádření úřadu opakovat.

„Chceme ujistit obyvatele Starého Města, že uděláme vše pro to, aby je čtvrtá etapa revitalizace co nejméně omezila,“ dodává mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

ZM 1/2015 - S

29.1.2015


Usnesení č. ZM 15 01 07 02

Zastupitelstvo města projednalo změny Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město a

odvolává


člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město s právem hlasovacím paní
Lucii Schejbalovou a
jmenuje

Mgr. Annu Zemanovou řádným členem Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
s právem hlasovacím.



ZM 3/2015 - 8


26.3.2015



Usnesení č. ZM 15 03 04 01


Zastupitelstvo města projednalo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město ke dni 31. 12. 2014 a tuto

schvaluje.



ZM 4/2015 - 8

23.4.2015




Usnesení č. ZM 15 04 05 10

Zastupitelstvo města projednalo informaci o předložení projektu „4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ a

schvaluje

zařazení projektu „4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ do opatření/aktivity 1.1. Zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury, 1.2. Zlepšení stavu technické infrastruktury, 2.1. Obnova veřejných ploch, 5.1. Obnova a doplnění zeleně, 5.2. Doplněková infrastruktura pro obyvatele Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město, reg. číslo: 1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne 23.3.2009 rozhodnutím č. 54/2009.



Co se staví a bude stavět?

Vedení radnice svolalo tiskovou konferenci, na které vyjmenovalo některé investiční akce plánované na nadcházející měsíce. „Chcěli jsme seznámit veřejnost s tím, že město neinvestuje pouze do viditelných a velkých akcí v rámci IPRM, ale také do menších, ale neméně důležitých oprav dešťových kanalizací a mostků,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. V létě tedy dojde na opravu mostků na Lesné, které jsou důležité pro místní zemědělce. Opravu dešťové kanalizace v Jelení ulici v Horním Oldřichově a v ulici V Sídlišti zahájí město po

výběru dodavatele. Po zpracování projektové dokumentace a výběru dodavatele začnou práce na opravě kanalizace v Základní škole Vojanova. Opravy střešního pláště a zateplení by se měla v dohledné době dočkat Mateřská škola v Krásném Studenci. Dojde i k opravě poslední části Žižkovy ulice, kde bude zbudována výhybna. Také se mluvilo o Kamenické, která lidem hodně trápí, ta je však ze strany města již dořešena, nyní vše závisí na SVS (vodovody a kanalizace), ale předpokládá se, že by do podzimu měla být hotova. -lak, lp-

Děčín je obec přátelská rodině

Titulem Obec přátelská rodině se nyní může pyšnit město Děčín, které v soutěži MPSV uspělo v kategorii měst s počtem obyvatel nad 50 tisíc a získalo tak dotaci ve výši 275 000 Kč. Ocenění a šek převzala z rukou ministryně práce a sociálních věcí, Michaleny Markové, náměstkyně primátorky Děčína, Hana Cermonová.

„Do soutěže jsme vstupovali s projektem Město pro rodiny, který navazuje na Koncepti prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018, jehož cílem je podpořit rodinu v celém jejím generačním spektru,“ řekla Hana Cermonová. Právě z dotačních peněz se má projekt zaměřený na seniory, rodiče a děti realizovat. -lak-



LÉTO SE SOCHAMI V PODZÁMČÍ

Krásnou mezinárodní akcí je výstava „Léto se sochami“ v jižních zámeckých zahradách, jejíž vernisáž (na snímku) proběhla v pátek 29. května. Úvodní slovo měli zleva Klaus Hanke, primátor Pirny, Marie Blažková, primátorka Děčína, Christiane Stoebe, kurátorka výstavy, a Iveta Krupičková, ředitelka Zámku Děčín (hovoří). Hudební doprovod obstarala Daniela Pacovská s Děčínským jazzovým kvartetem. Velkou zásluhu na uspořádání výstavy s třiceti díly sochářů z ČR i SRN má Soňa Kapičová z děčínského magistrátu. -ble-

AGENTURA OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY o.s. kontaktní místo: Teplická 26, Děčín IV

Nabídka služeb osobní asistence do domácnosti pro občany města Děčín

Zajišťujeme terénní sociální službu, která dopomáhá k:

- zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- osobní hygieně
- zajištění stravy

- zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- obstarávání osobních záležitostí
- uplatňování práv, oprávněných zájmů


Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Zajištění péče je po dobu 24 hodin denně dle individuálních potřeb uživatele.

Eva Zaiptová
tel. 723 123 050
zaiptova@asistencedc.cz



Žaneta Šefčíková
tel. 724 588 257
sefcikova@asistencedc.cz

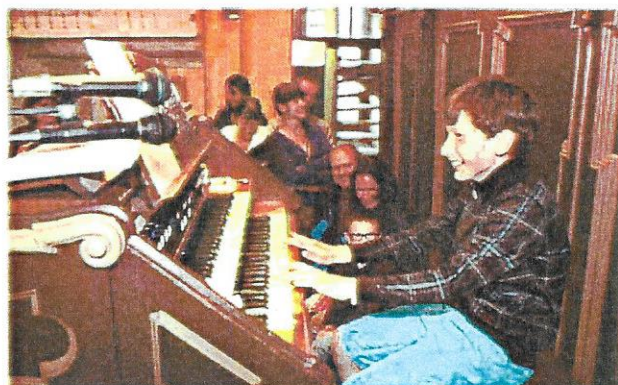

NOC KOSTELŮ JIŽ NA 20 MÍSTECH

Poslední květnový páteční večer a noc se veřejnosti již tradičně otevřely všechny přístupné i běžné nepřístupné sakrální památky, aby lidem ukázaly své kouzlo. Letos jich v Děčíně a okolí bylo rekordních dvacet, od kostela Povýšení sv. Kříže po kapličku v Ludvíkovcích. Náš snímek je z chrámu Povýšení sv. Kříže, kde Jan Záhora nechal pod svým dohledem „zahřát“ návštěvníky na varhany. Program v děčínských kostelích byl bohatý, vystoupily Děčínský chrámový sbor, sešlost SaH, Con Brio, SoliDeo, ZUS, duo Gaeilge aj. -ble-

Ombudsmanka pro nás v Ústí otevřela svůj stánek

Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv ČR, navštívila ve čtvrtek 4. června Ústí nad Labem. Jednala s vedením krajského úřadu i tajemníky obcí Ústeckého kraje, navštívila Domovy pro osoby se zdravotním

poškozením v Ústí, účastnila se setkání s občany v Severočeské vědecké knihovně a rovněž oficiálně otevřela stánek Kanceláře veřejné ochránkyně práv ve vestibulu krajského úřadu. -ryt-

Voda instalace

Baterie

Umývadla

Doplňky

Jany

LETNÍ SLEVY

Prodejna:
Březová 33/370
areál školní jídelny
405 01 Děčín III

Otevřeno:
Po-Pá 7.00-18.00
So 8.00-11.00
tel.: 412 513 508

**Při nákupu
vám rádi
poradíme!**

Firmám
poskytujeme
slevy.

Platí do
30. 9. 2015

Marie Blažková: zavázali jsme se k opravám majetku města

Vážení občané, je to přibližně rok, co stojíme v čele města, a mnozí z Vás se ptají, co jsme udělali. Když pomenu dokončení velkých akcí bývalého vedení, je za námi spousta prací takzvaně neviditelných. Neviditelných proto, že to nejsou akce na přestřihávání pásek za účasti novinářů a politiků. Jde především o opravy a vylepšení stávajícího majetku města a k tomu jsme se Vám zavázali. Město není v úplně nejlepším stavu, s tím jistě souhlasíte, a proto opravy, přestože stojí statisíce a miliony,

takřka nejsou vidět. Pro Vaši představu jsme připravili přehled těch největších akcí, které letos proběhly nebo na kterých pracujeme. Ve výčtu (viz níže - pozn. red.) nenajdete všechny vyspravené ulice, je jich opravdu velké množství. Přesné vyčíslení oprav chodníků a silnic, mostků, propustků, opěrných zdí apod. tedy prací, po kterých lidé nejvíce volají, připravíme do nejbližšího čísla Zpravodaje a na webové stránky města.

Marie Blažková,
primátorka města Děčína



Akce připravené v minulém období (např. projekty IPRM, hrazeno z dotace), schváleno jejich dofinancování a realizace:

Rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulici - dokončení, Zahájená a dokončená úprava okolí kolem domova pro seniory, 4. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré město, Revitalizace prostoru před Billou v DC I, Rekonstrukce nádvoří - zámek, Prostor kolem zámecké sýpky.

Projektové dokumentace (PD) za účelem přípravy dalších investic - příprava na nové dotační výzvy, nebo bude 100% hrazeno z rozpočtu města:

víceúčelové hřiště + skatepark v DC III, komunikační napojení průmyslové zóny v Krokové ulici, v roce 2016 nový most, revitalizace sídliště Březiny - priorita z hlediska bezpečnosti - záchranné složky, kanalizace v Horním Oldřichově, Domov se zvláštním režimem - budova bývalého bowlingu v Křešicích - priorita, revitalizace historické části Podmokel - ul. Prokopa Holého + Husovo náměstí, řešení dopravy v historické části Podmokel.

Opravy zahájené nebo dokončené (z dotací nebo vlastního rozpočtu): Kanalizace Kamenická (nalezená) - PD + dílo, Výměna oken v Domově s pečovatelskou službou Boletice, Výměna oken v Domově s pečovatelskou službou Bynov, Zateplení MŠ Rakovnická DC III, Oprava mostků na Lesné (DC - 018P a DC - 019P) - PD + veřejná zakázka + předané staveniště, Oprava bytového domu v Tržní ul. - PD + veřejná zakázka + předané sta-

veniště, Oprava chlazení na zimním stadionu (výměník tepla), Výměna střešní krytiny Lidická 21 - havárie (bouřka), Rekonstrukce (strop a podlaha, osvětlení) tělocvičny ZŠ Dr. M. Tyrše - PD + veřejná zakázka + předané staveniště, Rekonstrukce kašny v Podmoklech (památník), Restaurování soch - Kaple Panny Marie Pomocné, Provedení nátěrů oblouků zimního stadionu ZS, Výměna povrchu ve sportovní hale Maroldova (malý sál), Výměna mostovky Oblouková ul., Oprava místní komunikace Nedbalova (odvodnění), Zajištění skalního masivu v Prostředním Žlebu, Zajištění skalního masivu - Šibeniční Vrch, Oprava dešťové kanalizace v Boleticích (propadlá vozovka v sídlišti), Rekonstrukce opěrné zdi v Žižkově ulici - 3. etapa, Odstraňování povodňových škod z roku 2013 (ul. 5. května - Bělá).

Loučení se sezónou na via ferrate

Letos navštívilo děčínskou via ferratu přes 20 000 osob. Soubor zajištěných lezeckých tras na Pastýřské stěně se stal obrovským lákadlem adrenalinových nadšenců a jednou z největších atrakcí vůbec. V sobotu 28. 11. proběhlo u via ferraty malé rozloučení s letošní úspěšnou sezónou. -lak-

DOBROČINNÝ DĚČÍNSKÝ RŮŽ

Pořadatelé hudebního dvojkoncertu Děčínský Růžák, Jaroslav Ho Pešák, jenž proběhl v létě v Bažantnici a na Střelnici, předali mír toto pondělí symbolické šeky handicapovaným dětem, pro kten pořádána. Elenka a její maminka Dita Szymanská děkovaly za čá KČ (snímek dole), Jaroušek a maminka Zdeňka Bräuerová i Noenkou Ivetou Deibertovou dostali shodné částky 10 750 Kč. Celkově i s výtěžkem festivalu 35 000 Kč, dalších 5 000 Kč poslal Valdemar konto Čertíků na kolech (Jaroušek + Noemi). Pořadatelé děkují pomoci Ústeckému kraji a městu Děčín, stejně jako dalším sponzorům lidem, kteří přispěli na dobrou věc ať už darem, nebo návštěvou kou



www.centrum pivovar.cz

CENTRUM
PIVOVAR
DĚČÍN

Mikulášská
nadílka

5. 12. od 15:30 h

Čertovská kouzla Magic Alexe

Andělské workshopy

Adventní věnce s LIBVERDOU | Kniha hříchů

Děčín zpívá koledy

Přítav Vašich nákupů

Chovatelské potřeby Janů

Brikety
dubové ... 65 Kč/10 kg
Brambory 11 Kč/kg

Velký výběr vodítek, obojků, škrabadel
a pelíšků pro domácí mazlíčky.

17. listopadu 1, Děčín 1 • 604 239 828



Pojď hrát HOKEJ!



Pro děti od 4 do 8 let

Trénink

Zimní stadion Děčín • ZÁŘÍ - BŘEZEN
středa 16:00 - 17:00 h. • sobota 8:30 - 9:30 h

Vybavení

BRUSLE • ZIMNÍ RUKAVICE • PŘILBA
(Nemusíte nic kupovat! Brusle Vám zapůjčíme, přilba může být např. cyklistická nebo lyžařská)

Cena kurzu

1000 Kč / sezóna (první tři tréninky zdarma)

Přihlášení

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT KDYKOLI
v průběhu celého roku.

Informace

Hlavní trenér: Mgr. Ondřej Michálek
mobil: (+420) 775 854 434
e-mail: o.michalek@hcdecin.cz

PRO NOVÉ HRÁČE
ROČNÍKU 2007
• **VŠE ZDARMA** •
+ ZAPŮJČENÍ BRUSLÍ



www.hcdecin.cz

facebook hcdecin

























Chceš taky reprezentovat?

ZAČNI S HOKEJEM U NÁS!

12 ročníků kluků může vstoupit reprezentativní
páto a být trenérem (případně klukem) v
místnímu oddělení HC Děčín (1955-2014)
Či Místní oddělení HC Děčín (1955-2014)



PŘÍPRAVKA HC DĚČÍN

Nezustejte unést brusle - NAUČÍME VÁS!
Tréninky probíhají 2x týdně pro všechny zájemce z Děčína,
před oddělením v oddělení trenérů a instruktorů.



www.hcdedin.cz

hcdedin







Čvero koní se tu honá,
Čvero koní pod jabloní.

První

druhý

třetí

čtvrtý

7

7/1

SE		TY
	TI	NA
KAR		KY
	DO	BI'
PA		RY
	DIČ	KA


5:2 ☐ 18:2 ☐ 6:2 ☐ 20:2 ☐
1:2 ☐ 4:2 ☐ 7:2 ☐ 6:2 ☐
4:2 ☐ 16:2 ☐ 4:2 ☐ 8:2 ☐

10, -1 -1, 40, -1 -1, 70, -1 -1


4:2 -





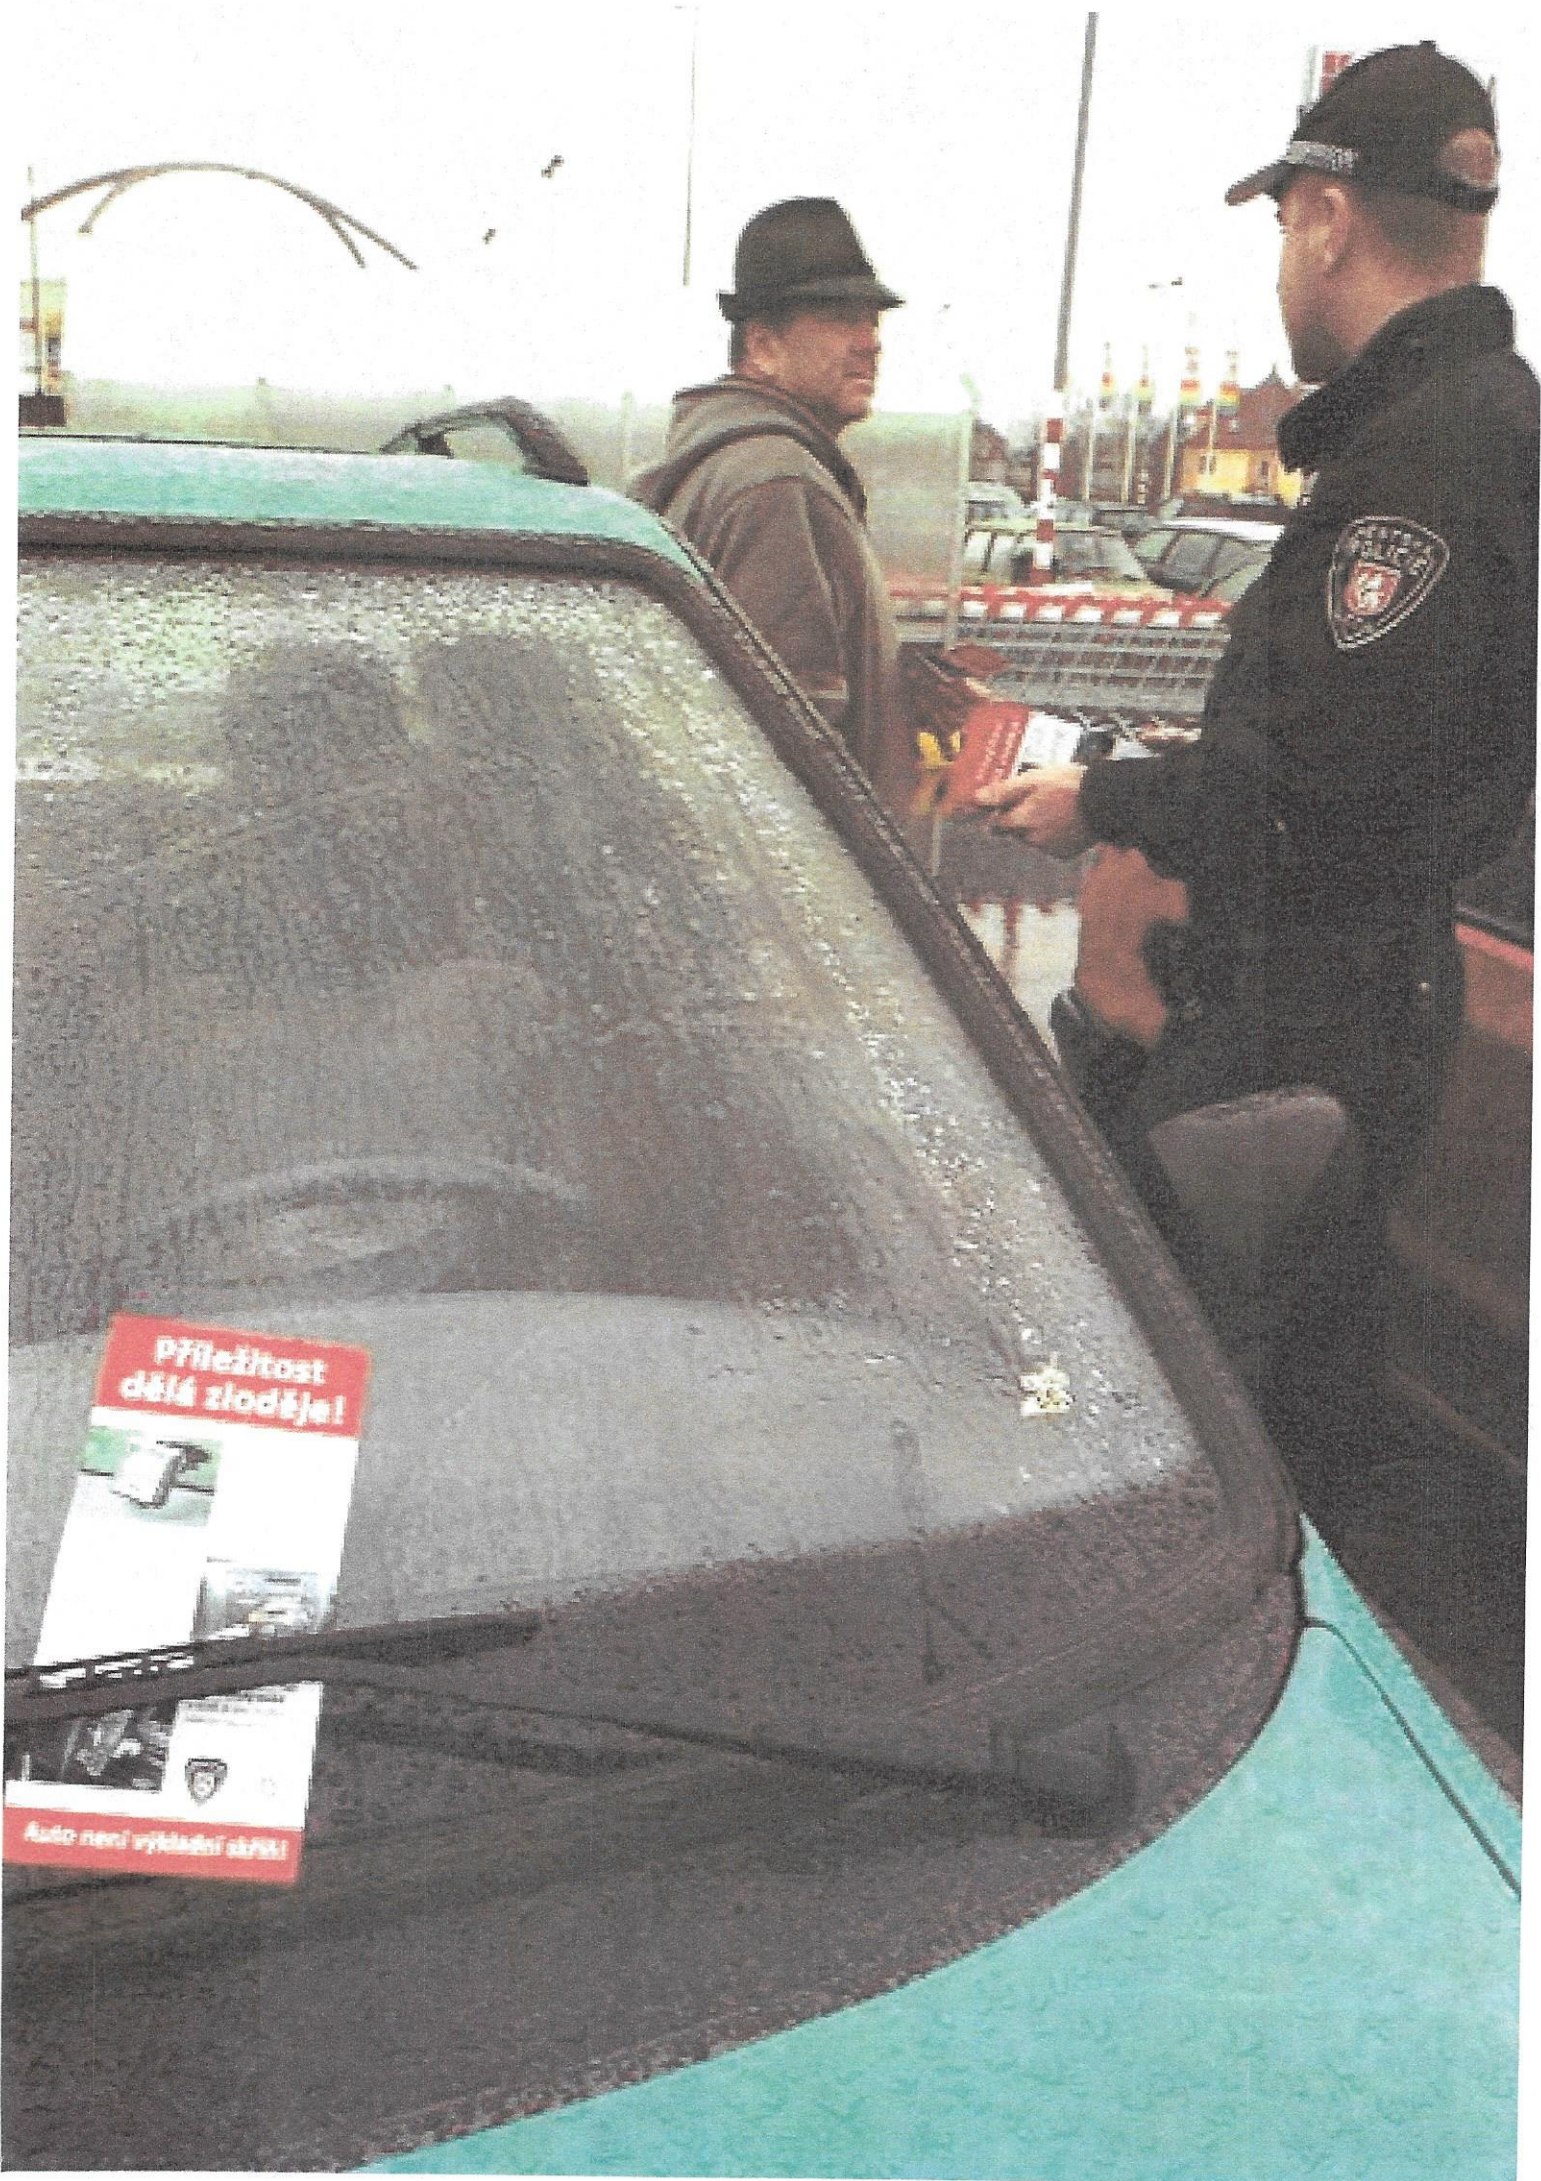



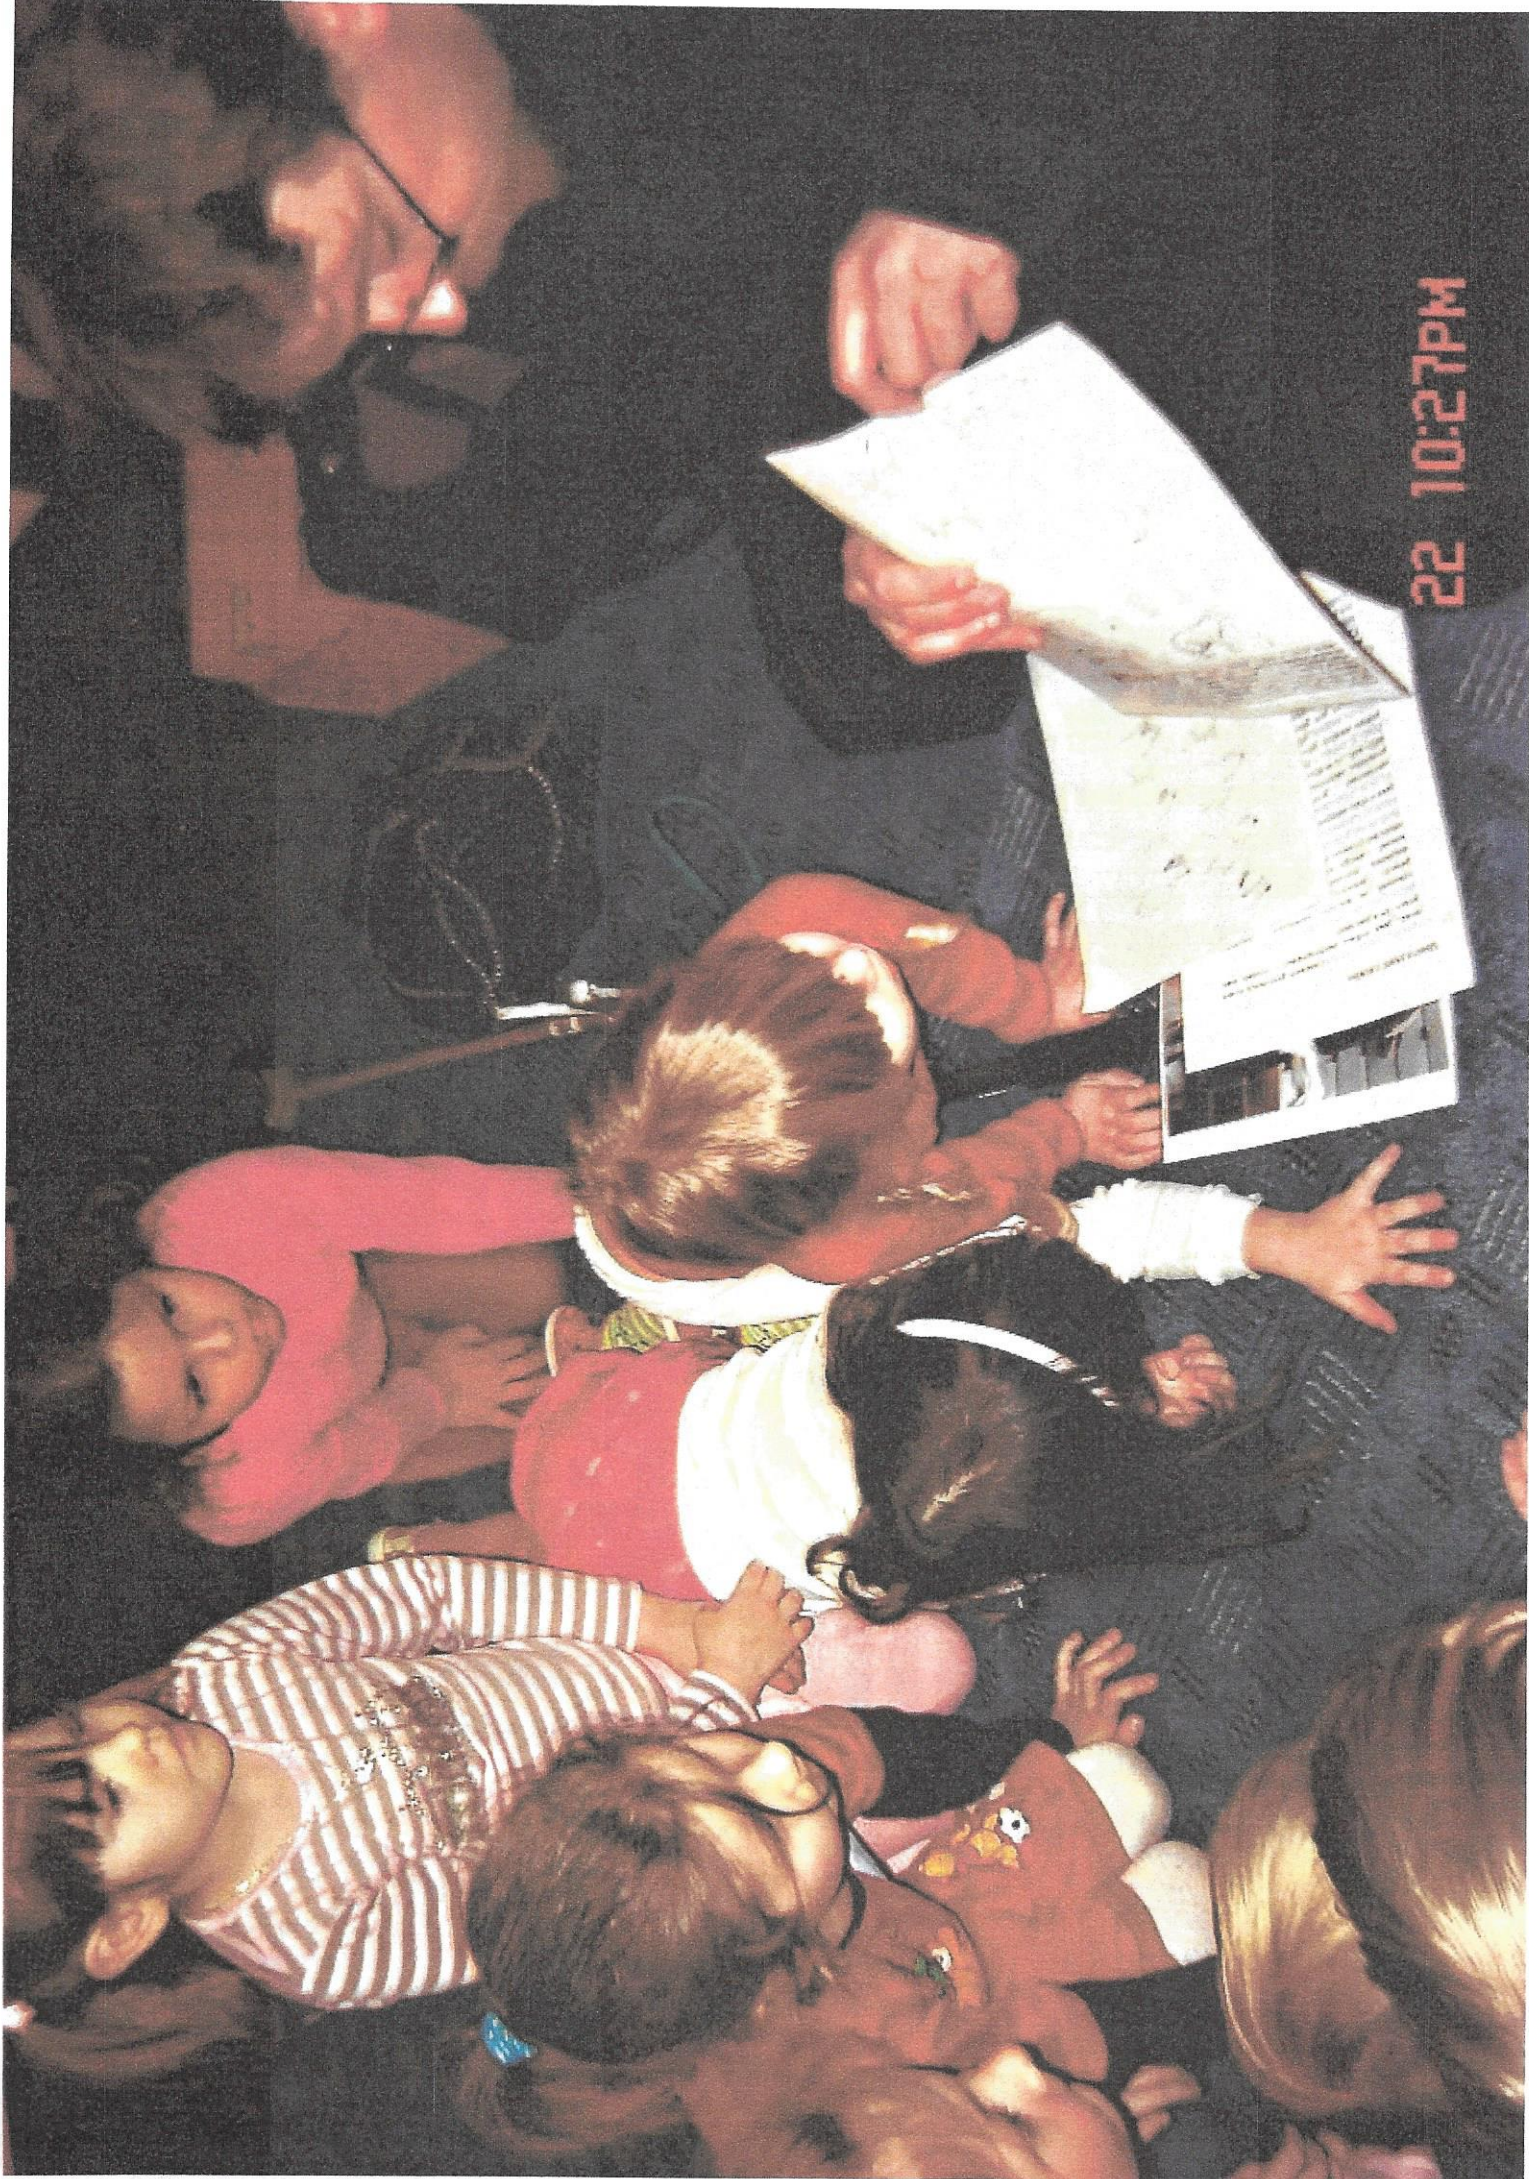

22 10:27PM









AZ SANACE a.s.

podporuje

Městský útulek pro toulavá
a opuštěná zvířata



[illegible]

3	b)	40	ČZ 1.06/5.2.00/ SVI domi Rakovníka 307/ 308, Dřehín	1	1	ukončena	110 779	325 822	56 992	167 625	54 672	160 802	
			IZ/08987	III	ukončena								
			ČZ 1.06/5.2.00/ Kvě. František Nunnenrova 139/ 40202	1	1	ukončena	530 053	1 558 980	530 053	1 558 980	487 703	1 134 423	
			IZ/08923	Dřehín	ukončena								
			ČZ 1.06/5.2.00/	STATENÍ BRTOVÉ PRAŽSKÝO BŘCHN	1	1	ukončena	288 974	849 923	235 444	692 484	166 557	485 754,50
			IZ/09335	Bytové družstvo Želivského 355/44	1	1	ukončena	3 706 000	10 900 000	3 706 000	10 900 000	3 702 542	10 888 828
			ČZ 1.06/5.2.00/	STATENÍ BRTOVÉ PRAŽSKÝO BŘCHN	1	1	ukončena	3 706 000	10 900 000	1 238 922	3 643 890	888 269	2 597 850
			IZ/09135	STATENÍ BRTOVÉ PRAŽSKÝO BŘCHN	1	1	ukončena	544 311	1 600 915	544 311	1 600 915	388 040	1 144 250
			IZ/09154	STATENÍ BRTOVÉ PRAŽSKÝO BŘCHN	1	1	ukončena	1 719 452	5 057 213	1 221 122	3 591 536	1 088 873,60	3 202 569,42
			IZ/09154	SVI domi č. 372 a 373 k.á. Dřehín	1	1	ukončena						
4	a)		ČZ 1.06/5.2.00/	STATU/HROM. MÍSTO DŘCHN	1	1	ukončena	14 065 939	16 545 811	13 972 867	16 438 668	13 972 707,98	16 438 480
Celkem			IZ/09272				107 808 838,64	166 329 726,79	102 220 778,07	167 479 767,00	69 249 349,48	119 339 422,49	
